

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
Nombre de proyecto:	Centro de Acopio y Servicios Complementarios de maíz amarillo					
Unidad Ejecutora:	Unidad de Negocios de Acopio y Servicios Complementarios de maíz duro. (UNM)					
Fecha inicio:	01/01/2013	Fecha fin:	31/12/2014	Duración:	1 año	
Coordinador:	Por designar		Técnicos - Responsables:	Por designar		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
Zona(s)	Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)	Coordenadas		
1, 2, 3, 4	Pindal, Puyango, Celica, Zapotillo	0	0			
Sector:	Subsector/Tipo de intervención:		Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total
5. Apoyo productivo	5.6. Fomento industrial y competitividad		Directos:	-	-	-
			Indirectos:	-	-	-
			Total	-	-	-
Tipo de ejecución:	Convenio de cooperación interinstitucional	Institución:	MAGAP -DEPROSUR EP.			
PRESUPUESTO:						
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%	0	5,000	10,000
Internas	Asignación inicial	17,768,00	80%	17768,0,00		
	Autogestión	-	-			
	Reformas	4,419,18	20%	4419,180,00		
Externas	GADs	-	-			
	Cooperación	-	-			
	Otros	-	-			
Total	22,187,18	100%				
META / OBJETIVOS:						
Meta:	La Empresa Pública DEPROSUR EP; cuenta con la Unidad de Negocios de Acopio y Servicios Complementarios de maíz con capacidad de gestión técnica, administrativa y financiera que le permiten cumplir con estándares de calidad.					
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado				Avance Físico %	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena productiva de maíz duro, mediante un sistemas de acopio y comercialización asociativa en los cantones de Celica, Puyango, Zapotillo y Pindal.				Al mes de diciembre de 2014; se ha construido un centro de acopio de maíz duro y de servicios complementarios en el cantón Pindal con una capacidad de almacenamiento de 9000 Tn.	
Propósito	Centro de Acopio y Servicios Complementarios en el cantón Pindal construido y en operación en el área de influencia del proyecto (Pindal, Celica, Puyango y Zapotillo).				Al final del año 2014, se cuenta con la infraestructura construida del centros de acopio y servicios complementarios de maíz.	
Componentes		Indicador			%	
Primer Semestre						
C1. Estudios de factibilidad para la construcción del centro de acopio de maíz amarillo elaborado		Al año 2012, la Empresa DEPROSUR EP.. cuenta con estudios de factibilidad para la construcción del centro de acopio y servicios complementarios de maíz.			100,00	
C2. Infraestructura construida, maquinaria y equipos implementados para el acopio de maíz.		A finales del año 2013, se cuenta con los recursos financieros para la construcción del centro de acopio y servicios complementarios.			-	
C3. Modelo de gestión del Centro de Acopio de maíz en la provincia de Loja.		A diciembre del 2013, se conforma la Unidad de Negocios para la implementación del centro de acopio y servicios complementarios de maíz.			-	
C4. Programa de producción y transferencia de tecnología a operadores de la planta desarrollado.		En el primer trimestre del 2014, se implementa un programa de producción y transferencia de tecnología a operadores del Centro de Acopio.			-	
Avance Físico Total Proyecto					25,00	
AVANCE PRESUPUESTARIO						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Asignación Inicial	17,768,00					
Reformas	4,419,18					
Total US\$	22,187,18	22,187,18	17,422,69	13,383,09	8,782,57	
Planificado	22,187,18	5,546,80	5,546,80	5,546,80	5,546,80	
Ejecutado	18,979,09	4,764,49	4,039,60	4,600,52	5,574,48	
% Inversión	85,54%	85,90%	72,83%	82,94%	100,50%	
Diferencia	3,208,09	782,31	1,507,20	946,28	-27,68	
Comprometido	17,187,18	17,328,38	0,00	-141,20	0,00	

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas reelevantes	Acciones tomadas	Observaciones
Recursos financieros insuficientes para la ejecución del proyecto a nivel institucional	Gestión ante el Ministerio de Agrícola, Acuicultura y Pesca (MAGAP) para el financiamiento del proyecto.	Se espera que la fase de construcción inicie el año 2015
OBSERVACIONES:		
Se suscribe convenio con el MAGAP para la transferencia del proyecto y espacio físico para la construcción del Centro de Acopio de Maíz en la parroquia 12 de Diciembre del cantón Pindal.		


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Convenio suscrito con el MAGAP
 Proyecto de factibilidad
 Actas de reuniones

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Centro de Acopio y Servicios Complementarios de maíz amarillo

GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014

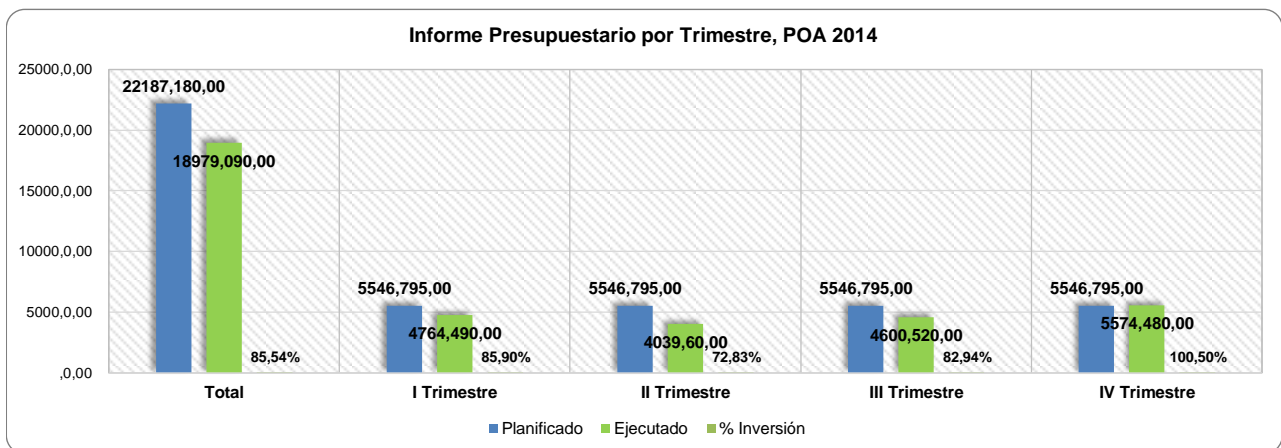

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014

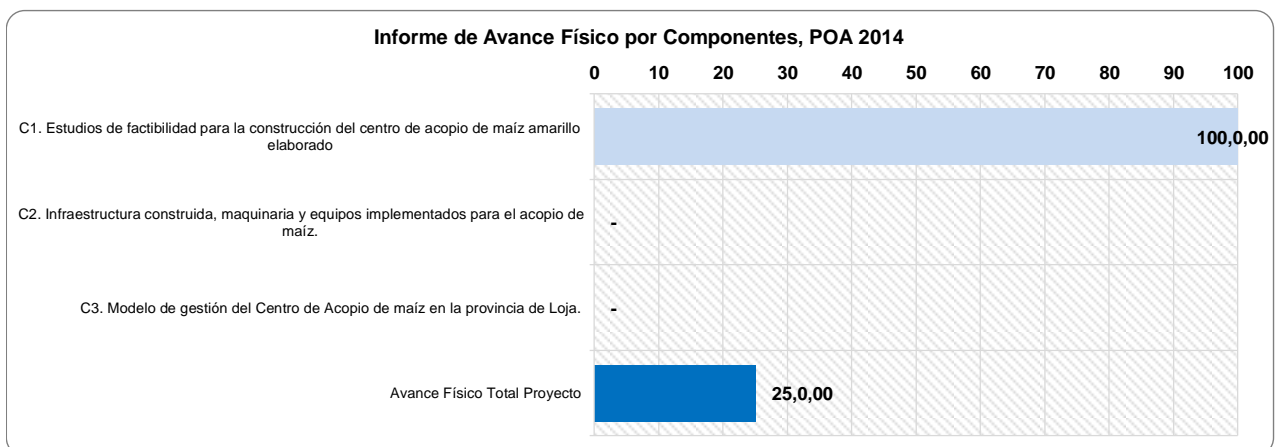

Fuente: DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--	--	--
