

**MEMORANDO 0447 REP-GOM-2015**

**PARA:** Ing. María Yolanda Mora.  
**GERENTE GENERAL DE RIDRENSUR.**

**DE:** Ing. Manuel Carrión Jiménez.  
**TECNICO O & M RIDRENSUR EP.**

**ASUNTO:** Informe de Inspección sector Anza Sistema de Riego Paquishapa.

**FECHA:** 07 de Agosto del 2015.

Por medio del presente, con un atento saludo, y en respuesta al oficio de usuarios del canal de riego Paquishapa del Sr. Klever González y Sr. Víctor Espinoza, con la sumilla del Gerente de Operación y Mantenimiento del trámite N°. 9167, me permito informar de la inspección realizada en el sistema de riego, cantón Saraguro.

**1. Introducción.**

La Prefectura de Loja a través de la Empresa de Riego y Drenaje del Sur (RIDRENSUR E.P), en su afán y como una política institucional es el fortalecer el desarrollo agro-socio económico de los sectores productivos de la provincia, brindando el apoyo necesario para la ejecución de estudios y construcción de sistemas de riego, procurando de esta manera incrementar la productividad agrícola y pecuaria que mejore la calidad de vida de los habitantes de nuestra provincia, garantizando el mejoramiento de prácticas de soberanía alimentaria y buen vivir, con la atención a la operación y mantenimiento de los sistemas de riego.

**2. Ubicación.**

La inspección de la conducción se realizó en la parroquia Urdaneta, sector Anza. Además se inspecciona la plataforma sector Bahin por problemas de derrumbes.

**3. Diagnóstico.**

Este sector es una zona netamente agrícola, que durante años se ha beneficiado del sistema de riego, pero por existir fallas geológicas en tramos de la conducción se presentan rupturas y colapso del canal y tuberías, además por el fuerte temporal invernal se han producido derrumbes en la plataforma que necesitan ser desalojados.

**4. Informe de la Inspección.**

La inspección se la realizó el día viernes 24 de julio del presente, con la presencia del Ing. Carlos León y Sr. Sixto Espinoza (usuario). En el recorrido se evidencio los daños causados en las tuberías, y derrumbes en el canal y plataforma (anexo fotográfico); que se detalla a continuación:



1. *Daños en tuberías:*
  - *Material de tubería: PVC*
  - *Diámetro de tubería: 300mm*
  - *Coordenadas Inicio de tubería: X= 703267 ; Y= 9599809*
  - *Coordenadas Fin de tubería: X= 703213 ; Y= 9599895*
  - *Longitud de tubería: 40.00m*

*Existen daños evidentes y ya reparados por los usuarios de forma emergente, es un tramo de falla geológica que con el lapso del tiempo las mismas volverían a colapsar; revisados los listados de materiales de tuberías disponibles en la bodega de RIDRENSUR EP no contamos con los mismos para poder disponer de estos. Con estos antecedentes y considerando que es un tramo donde se proyecta el paso del sifón, me permito sugerir lo más pronto la ejecución del paso por sifón que además permite la captación de más agua para el sistema, ya que de la captación dos donde lo están realizando no les abastece en época de verano.*

*Se proyecta realizar trabajos de desalojos y nivelación en el paso de tuberías colapsadas, además adquirir la tubería de 300mm para el tramo de conducción colapsada.*

2. *Derrumbes en canal y plataforma:*
  - 2.1. *Derrumbe Uno:*
    - *Coordenadas Inicio: X= 704143 ; Y= 9598867*
    - *Coordenadas Fin: X= 704130 ; Y= 9598691*
    - *Longitud: 14.32m*
  - 2.2. *Derrumbe Dos:*
    - *Coordenadas Inicio: X= 704116 ; Y= 9598679*
    - *Coordenadas Fin: X= 704095 ; Y= 9598679*
    - *Longitud: 21.00m*
  - 2.3. *Derrumbe Tres:*
    - *Coordenadas Inicio: X= 703794 ; Y= 9598582*
    - *Coordenadas Fin: X= 703781 ; Y= 9598567*
    - *Longitud: 26.86m*
  - 2.4. *Derrumbe Cuatro:*
    - *Coordenadas Inicio: X= 703599 ; Y= 9598365*
    - *Coordenadas Fin: X= 703588 ; Y= 9598350*
    - *Longitud: 18.60m*
  - 2.5. *Derrumbe Cinco:*
    - *Coordenadas Inicio: X= 703583 ; Y= 9598348*
    - *Coordenadas Fin: X= 703558 ; Y= 9598336*
    - *Longitud: 27.73m*
  - 2.6. *Derrumbe Seis:*
    - *Coordenadas Inicio: X= 703539 ; Y= 9598330*
    - *Coordenadas Fin: X= 703516 ; Y= 9598330*
    - *Longitud: 23.00m*



2.7. Derrumbe Siete:

- Coordenadas Inicio: X= 703461 ; Y= 9599660
- Coordenadas Fin: X= 703470 ; Y= 9599664
- Longitud: 9.85m

Existen daños que no permiten circular en la plataforma y a su vez taponan el canal donde no está embaulado, el tramo de derrumbes es la que da a la captación uno sector Anza, la misma que no está operativa por la falta de construcción del sifón. Con estos antecedentes y considerando que es un tramo donde se proyecta el paso del sifón, me permito sugerir lo más pronto la ejecución del paso por sifón que habilitaría la utilización de la captación uno.

**5. Conclusiones:**

- La tubería presenta daños pero está operativa.
- Existe derrumbes en el canal y plataforma para la captación uno que no está operativa.

**7. Recomendaciones:**

- Considerar el cambio de las tuberías para evitar futuros daños y paralización en las actividades de riego.
- Considerar la ejecución del sifón para habilitar la captación uno.

Atentamente.

VISTO BUENO

  
Ing. Manuel Carrión Jiménez  
TECNICO DE RIDRENSUR EP

  
Ing. Ángel Collahuazo  
GERENTE DE OPER & MANT.





ANEXO FOTOGRAFICO

**DAÑOS EN TUBERIAS POR FALLA GEOLÓGICA**



**DERRUMBE UNO**

**DERRUMBE DOS**







**DERRUMBE TRES**



**DERRUMBE CUATRO**




**DERRUMBE CINCO**



**DERRUMBE SEIS**



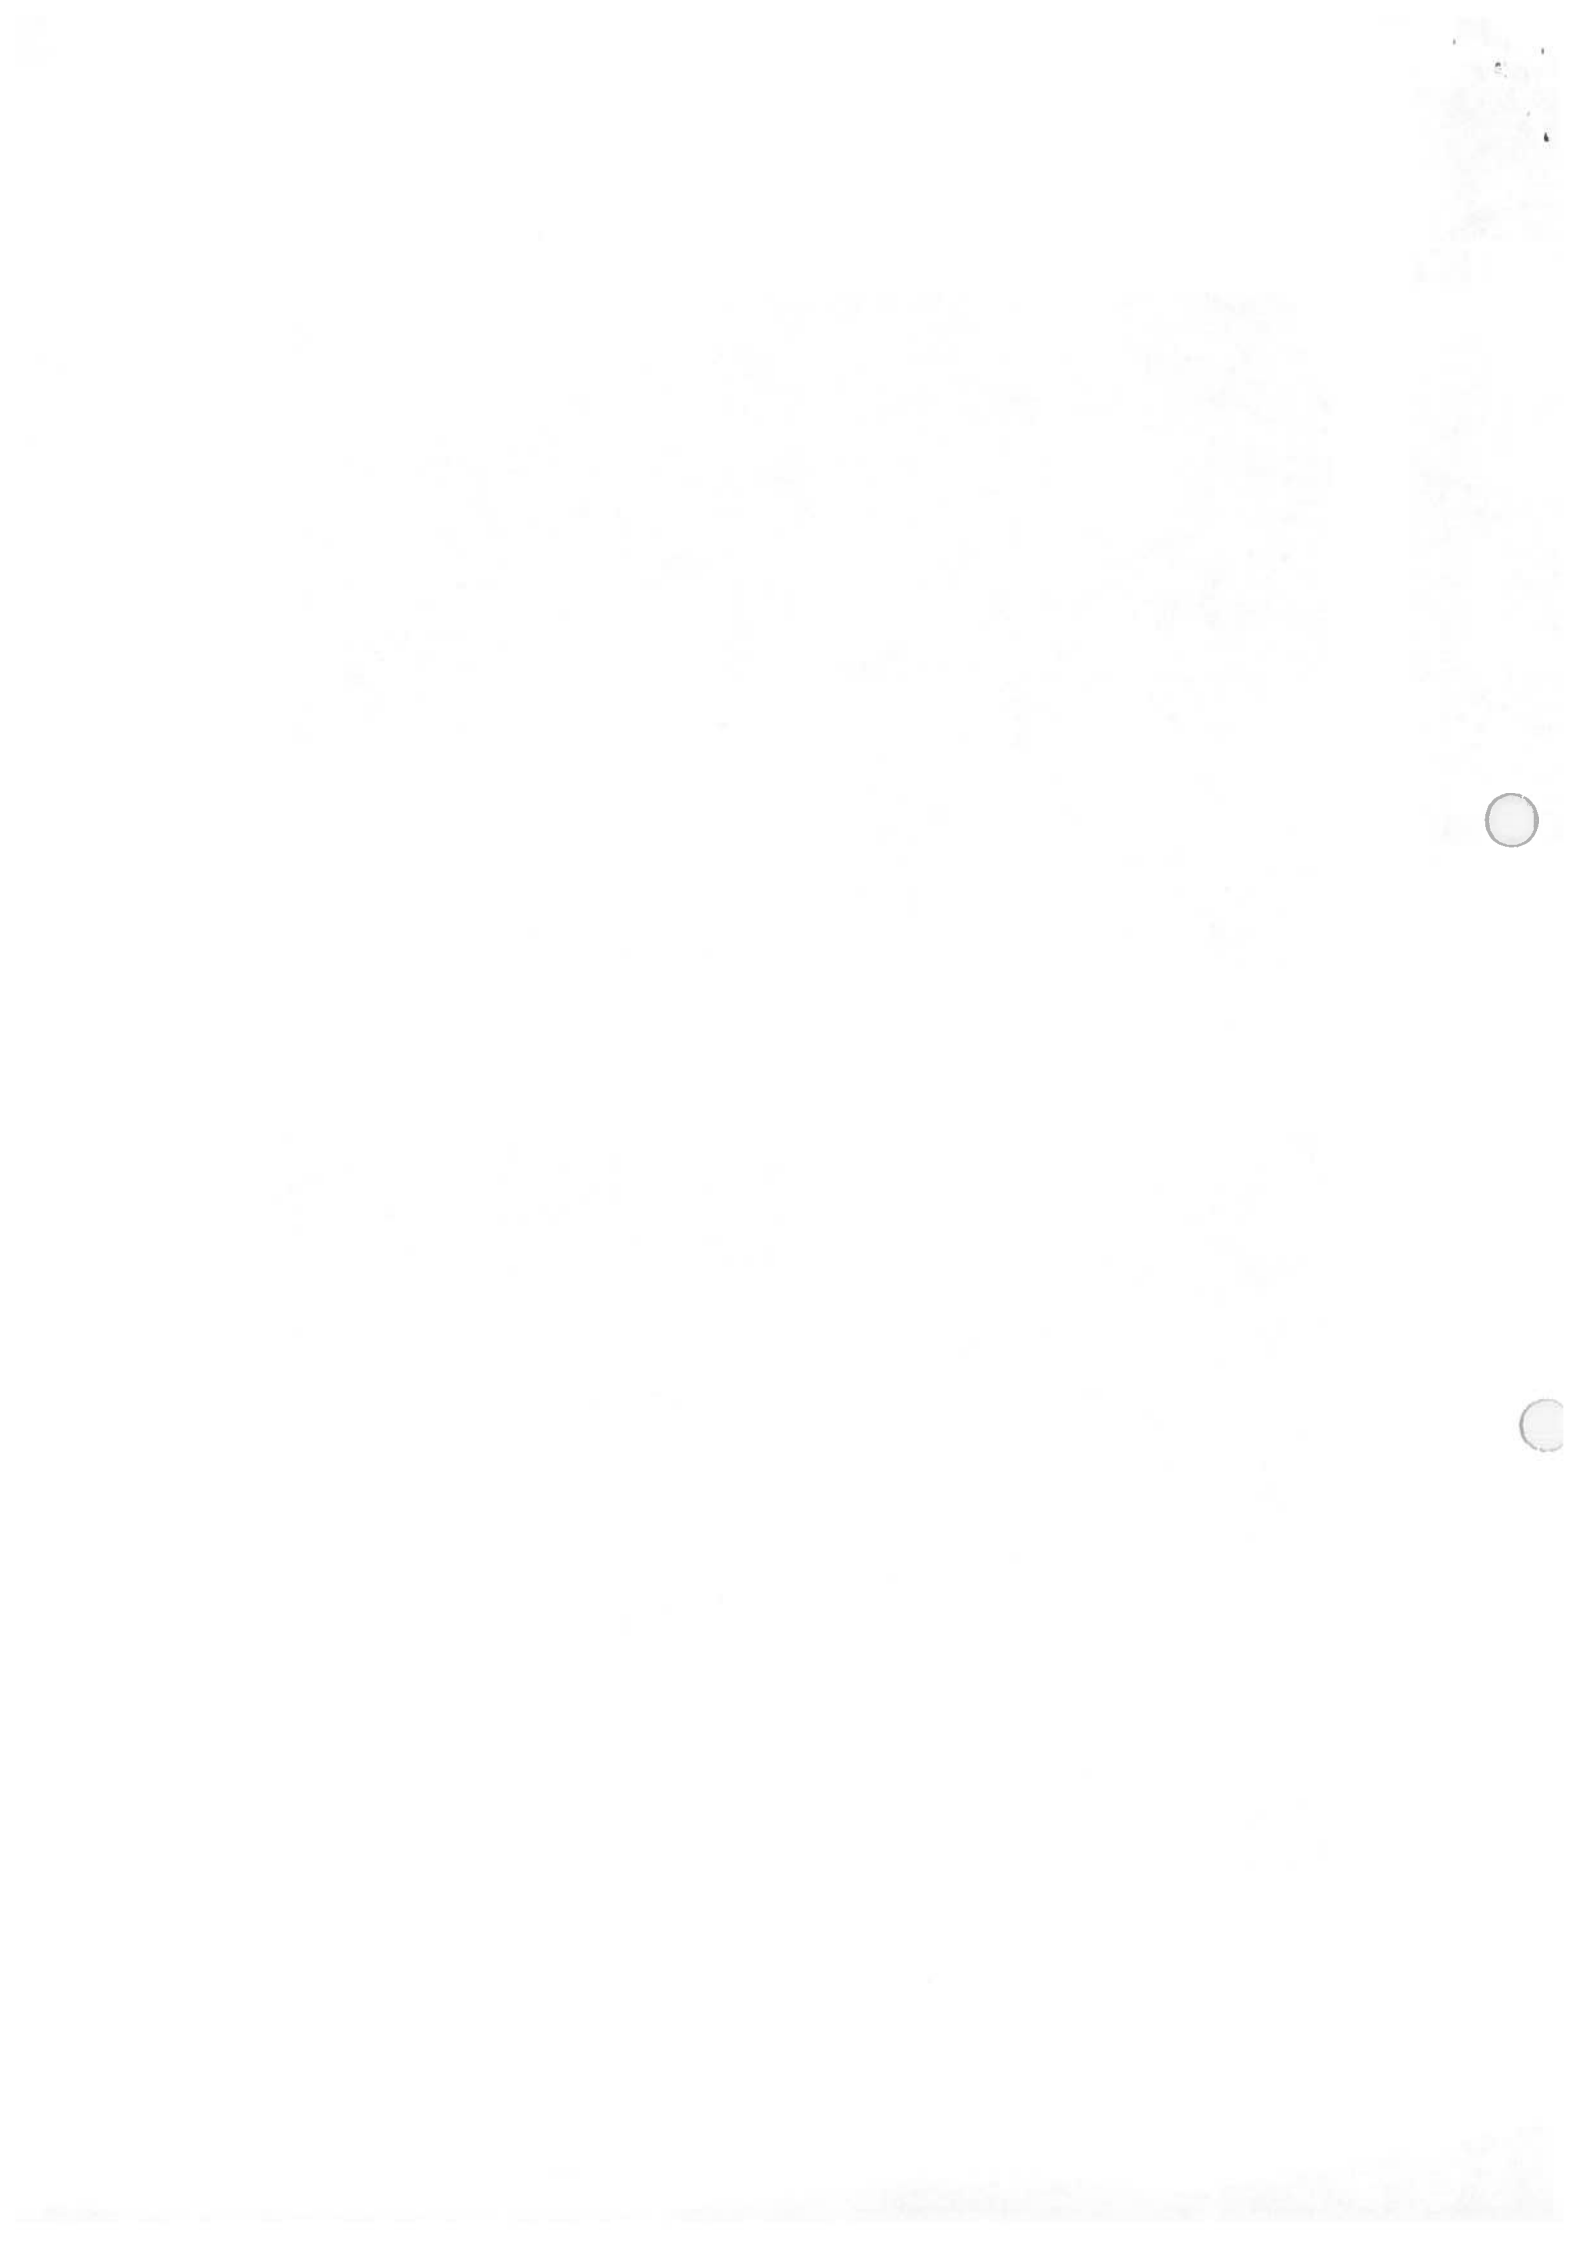

**DERRUMBE SIETE**





10

**Listado de Documentos 2015 entregados por la Jefatura: Gerencia Operación y Mantenimiento (2015/08/06)**

Nº	Origen	Doc. Nº	#Foj.	Destino	Asunto	Fecha	Responsable
9573	G.O.M	M 446	1 Expediente	Gerencia Administrativa Financiera	Movilizaciones y pago de Viaticos	2015-08-06 10:00:00	<i>[Handwritten Signature]</i>

Total de documentos enviados: 1

*2015-08-06*  
*1045*

[Imprimir] - [Regresar]



**AMEMORANDO Nro. 446- REP-GOM-2015**

**PARA:** Dra. Lilia Espinoza  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**DE:** Ing. Ángel Collahuazo Astudillo  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

**ASUNTO:** Movilizaciones que no se les reconoce el pago

**FECHA:** 06 de agosto de 2015.

Con relación al trámite 9573, me permito solicitarle comedidamente se aclare el no pago de las movilizaciones de los técnicos que cumplen sus labores en parroquias del cantón Loja, en razón de que en la Resolución de la PREFECTURA Nro. 21-RP-RDE-2014 establece el pago viáticos, subsistencias o alimentación a los servidores y obreros públicos que se desplazan fuera de su lugar habitual de trabajo. Esta petición la realizo en vista de que el Ing. Hernán Armijos, es el técnico que se desplaza semanalmente para cumplir su trabajo a las parroquias Malacatos, Quinara.

Además adjunto el Cálculo de las movilizaciones 674 y 705 en las cuales se han dado observaciones las mismas que ya han sido rectificadas.

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente,


  
Ing. Ángel Collahuazo Astudillo  
**GERENTE DE OPER Y MANT.**

**AC/JJJ**

**Archivo:** Personal

**G.A.F**

**Adjunto movilizaciones con sus respectivos cálculos**  
**681-708-683-660-596-707-642-705-674**

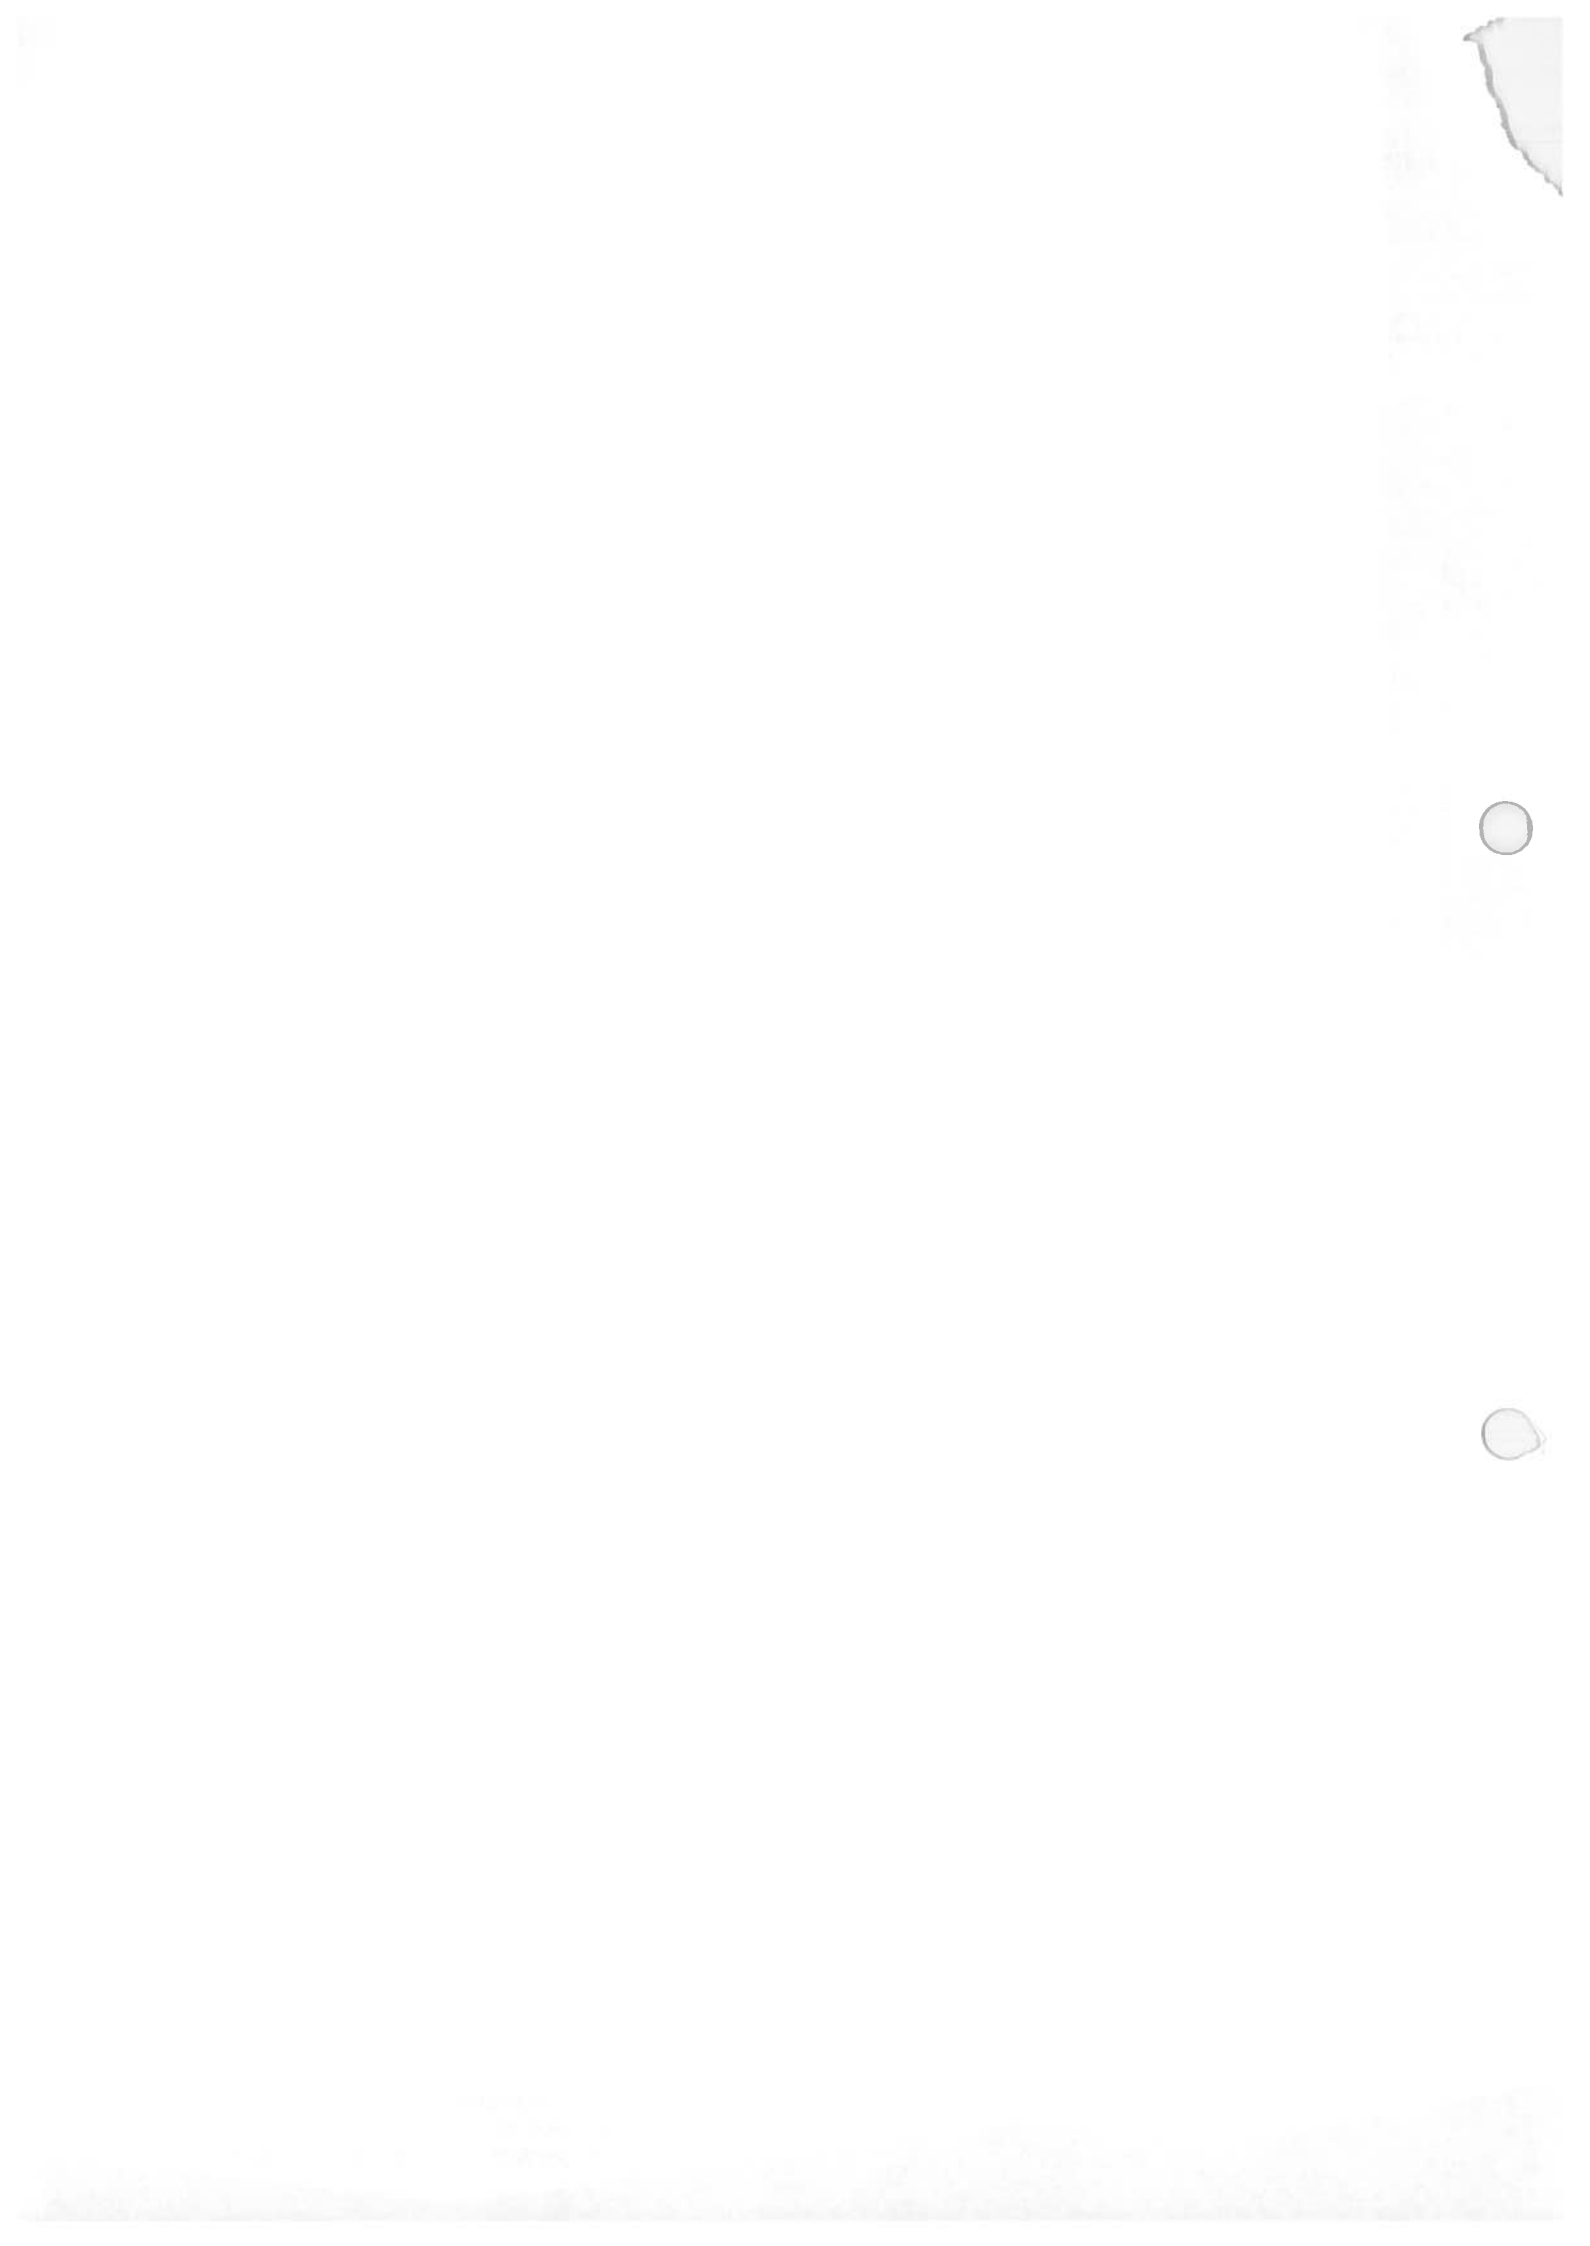



**Listado de Documentos 2015 entregados por la Jefatura: Gerencia Operación y Mantenimiento (2015/08/05)**

Nº	Origen	Doc. Nº	#Foj.	Destino	Asunto	Fecha	Responsable
7739	GERENCIA GENERAL	M 445-rep-gom-2015	1 EXP	Gerencia Planificación	DISPOSICION INFORMACION PARA REUNION DIRECTORIO PRESENTE NECESIDADES, PROCESOS PENDIENTES PARA RE FINANCIAR	2015-08-05 10:37:00	<i>M. T. - 2015-08-05 10h37'</i>
Total de documentos enviados: 1							
							[Imprimir] - [Regresar]

17-18





## MEMORANDO Nº 445-REP-GOM-2015

**PARA:** Ing. Edgar Rivas Jaramillo  
**GERENTE DE PLANIFICACIÓN DE RIDRENSUR - EP**

**DE:** Ángel Collahuazo Astudillo  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

**ASUNTO:** Reforma presupuestaria

**FECHA:** 05 de agosto de 2015

Como es de su conocimiento, el mal estado de la infraestructura de riego y la fuerte temporada de lluvias afectó a los sistemas de riego públicos de la provincia de Loja. En base a las inspecciones y diseños se determina un requerimiento aproximado de USD \$ 335 731,89 para ejecutar obras correctivas, principalmente en la conducción principal; debo señalar que en el POA 2015 se cuenta con la partida 750102 Mejoramiento (avances) de redes secundarias, para su ejecución se requiere de los estudios correspondientes, que en la actualidad no se dispone.

Por tal motivo, existe la necesidad institucional emergente para incrementar la partida 750102 para el "Mejoramiento de la conducción principal de los SRP.....", para ello solicito se utilice el monto de la actividad presupuestaria "Mejoramiento (Avances) de redes secundarias...". El detalle de las variaciones sugeridas en la Proforma Presupuestaria 2015, son las que se detallan continuación:

Partida Presupuestaria	Actividad presupuestaria	Incremento \$ USD	Reducción \$ USD
750102	Mejoramiento de la conducción principal de los SRP (No transferidos: La Palmira, Campana-Malacatos, Cochas San Vicente, Limas Conduriaco, Papaya; Transferidos: Quinara, Vilcabamba, Santiago, La Era, El Ingenio, Airo Florida, Sanambay-Jimbura, Jorupe Cangochara, Chiriyacu-Lucero, Chucchucchir, Paquishapa, El Tablon, Macará)	337 701,21	
750102	Mejoramiento (avances) de redes secundarias en los SRP no transferidos: La Palmira, Campana-Malacatos, Limas Conduriacu, La Papaya		100 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>337 701,21</b>	<b>100 000,00</b>

Atentamente.

  
 Ing. Ángel Collahuazo Astudillo  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

AC/JJJ  
 CC: Gerencia Operación y Mantenimiento



35

**Listado de Documentos 2015 entregados por la Jefatura: Gerencia Operación y Mantenimiento (2015/08/05)**

Nº	Origen	Doc. Nº	#Foj.	Destino	Asunto	Fecha	Responsable
9871	G.O.M	M 444	VARIAS	Gerencia Técnica	Pedido de materiales y accesorios	2015-08-05 08:41:00	RODRIGUEZ A. 08451
Total de documentos enviados: 1							
							[Imprimir] - [Regresar]



## MEMORANDO N° 444-REP-GOM-2015

**PARA:** *Ing. Randón Ortiz*  
 GERENTE TECNICO RIDRENSUR - EP

**DE:** *Ing. Hernán Vinicio Armijos Armijos*  
 TECNICO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,


**ASUNTO:** **Pedido de materiales y accesorios.**

**FECHA:** 04 de Agosto de 2015

En cumplimiento a la designación de Técnico de Riego de RIDRENSUR- EP, en el marco del Convenio Interinstitucional de cofinanciamiento N° 42-DPS-214, para la ejecución del proyecto "DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE LAS HUERTAS AGROFORESTALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN LA PARROQUIA FUNDOCHAMBA", solicito la compra de material y accesorios para la instalación de la red de conducción principal de agua para riego", con tubería de 110 mm, que se detallan en el siguiente cuadro.

### PROYECTO DE RIEGO FUNDOCHAMBA: Lista de materiales para Instalación de red de distribución y ramales

	DESCRPCION - RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	Precio UNITAR	TOTAL
1	Manguera de PE , 3", 105 PSI , 50 metros	rollo	10	212,30	2123,00
2	Unión de PE, 3"	unidad	10	2,50	25,00
3	Adaptador PVC, hembra, 1 mpa, 90 mm	unidad	8	4,50	36,00
4	Adaptador flex, PE, macho, 3"	unidad	8	2,50	20,00
5	Codo PVC, 1mpa, R/L -P-E/C, 110 mm x 90°	unidad	5	19,20	96,00
6	Codo PVC, 1mpa, R/L -P-E/C, 110 mm x 45°	unidad	7	18,75	131,25
7	Codo PVC, 1mpa, R/L -P-E/C, 110 mm x 22,5°	unidad	20	17,80	356,00
8	Codo PVC, 1mpa, R/L -P-E/C, 110 mm ,11,25°	unidad	35	16,75	586,25
9	Codo PVC, 1mpa, E/C, 110 mm x 90°	unidad	15	12,10	181,50
10	Codo PVC, 1mpa, E/C, 110 mm x 45°	unidad	7	11,30	79,10
11	T PVC, E/C, 1 mpa, 110 mm	unidad	7	11,70	81,90
12	T Reductora PVC, E/C, 1 mpa, 110 x 90 mm	unidad	12	12,20	146,40
13	Union Soldable PVC, E/C, 110 mm	unidad	15	8,83	132,45

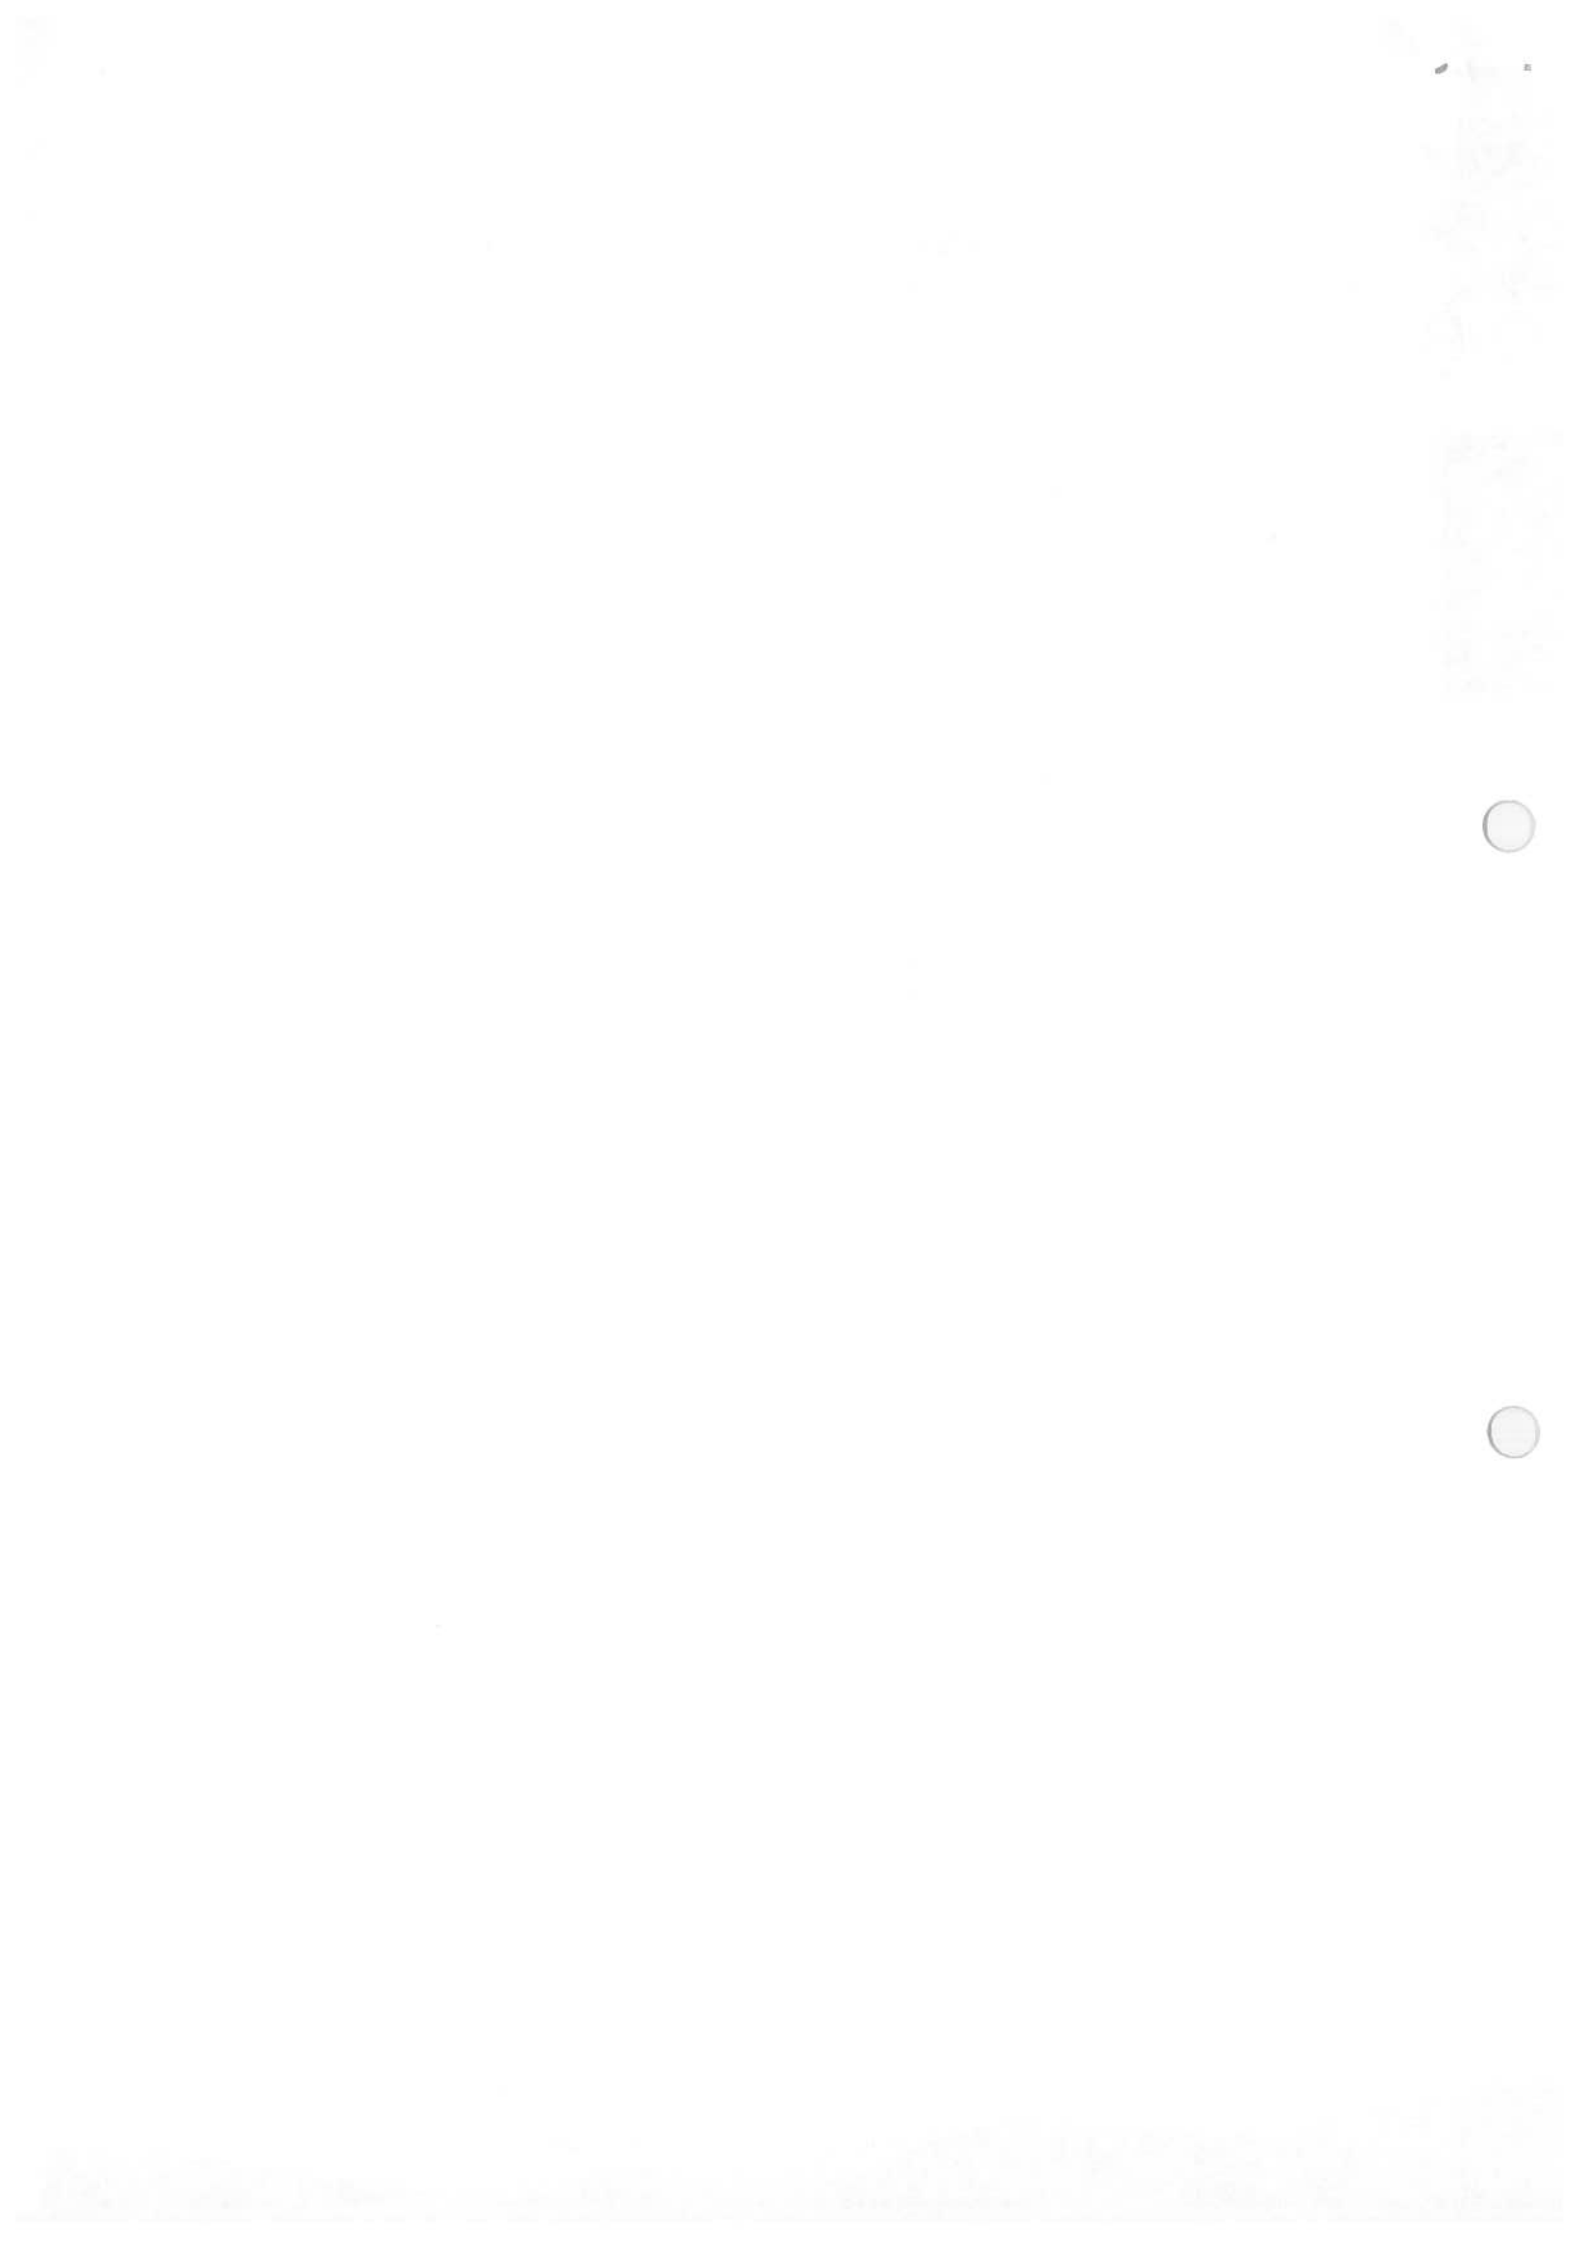





14	Universal PVC, E/C, 110 mm	unidad	5	25,40	127,00
15	Válvula de compuerta de bronce, reforzada, 4", 200psi, rosca hembra	unidad	5	85	425,00
16	Válvula de compuerta de bronce, reforzada, 3", 200psi, rosca hembra	unidad	10	125	1250,00
17	Adaptador PVC, macho, 4", 1mpa,	unidad	10	5,50	55,00
18	Adaptador PVC, macho, 3", 1mpa,	unidad	20	4,50	90,00
19	Válvula de Aire Triple Acción, 1",	unidad	12	56,80	681,60
20	Collarín plástico de 110 mm x 1"	unidad	12	4,95	59,40
21	Tapón PVC, S/E, 110 mm	unidad	3	5,80	17,40
22	Tapon PVC, S/E, 90 mm	unidad	6	4,35	26,10
23	Teflón, rollo grande	unidad	20	5,00	100,00
				<b>SUBTO TAL</b>	<b>6.826,35</b>
				<b>IVA 12%</b>	<b>819,16</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>7.645,51</b>

Son: siete mil seiscientos cuarenta y cinco 51/100 dólares

Esta compra deberá realizarse con cargo a los recursos comprometidos en el convenio como contraparte de RIDRENSUR EP.


Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes:

Atentamente,

Ing. Hernán Armijos Armijos  
**TECNICO DE OPER. Y MANT.**

Ing. Angel Collahuazo  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTEN**

C.C. Archivo Unidad Operación y Mantenimiento

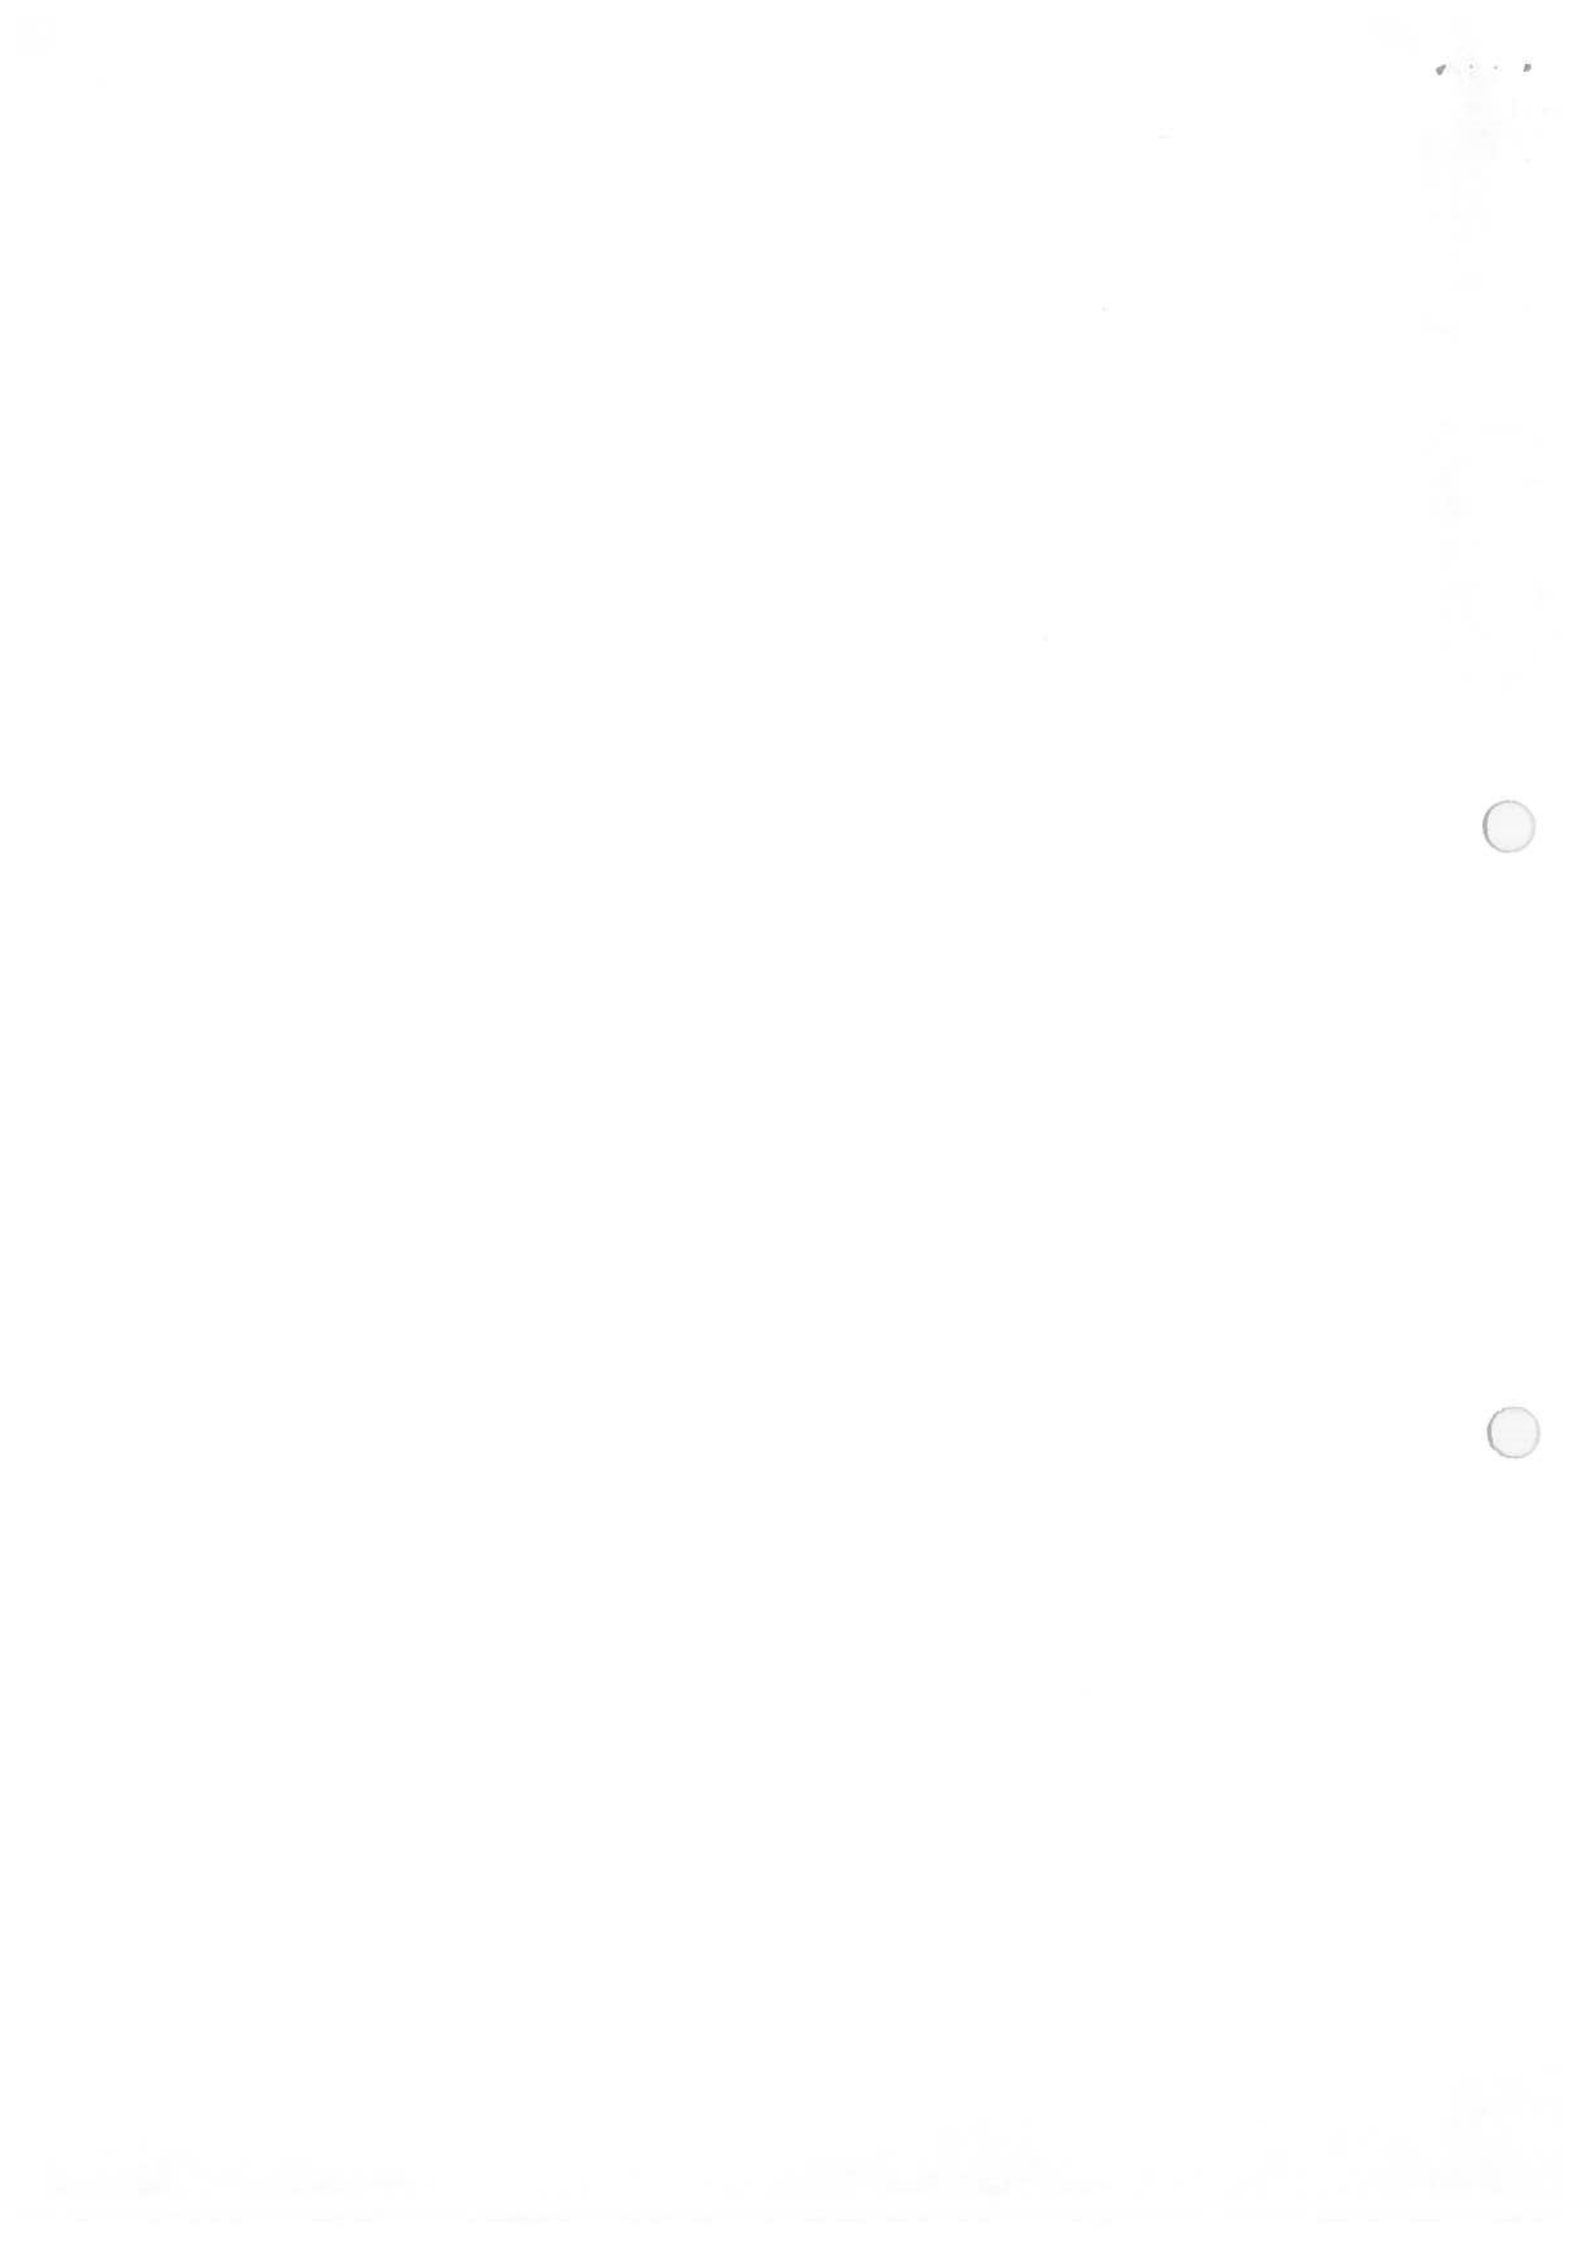

Listado de Documentos 2015 entregados por la Jefatura: Gerencia Operación y Mantenimiento (2015/08/05)							
Nº	Origen	Doc. Nº	# Foj.	Destino	Asunto	Fecha	Responsable
9808	G.O.M	M 443	VARIAS	Gerencia General	Cronograma de comisiones de la Gerencia de Operación- mantenimiento correspondiente a la Semana del 10 al 14 de agosto del presente	2015-08-05 08:37:00	<i>J. Man...</i>
Total de documentos enviados: 1							
							[Imprimir] - [Regresar]

*J. Man...*



**MEMORANDO Nro. 0443- REP-GOM-2015**

**PARA** Ing. María Yolanda Mora **GERENTE GENERAL RIDRENSUR**

**DE.** Ing. Ángel Collahuazo **GERENTE DE OPER. Y MANT.**

**ASUNTO:** Cronograma de comisiones de la Gerencia de Operación –  
Mantenimiento correspondiente a la Semana del 10 al 14 de Agosto del  
presente

**FECHA:** 05 de Agosto del 2015.

Por medio del presente me permito Adjuntarle **El Cronograma de Actividades de la Gerencia de Operación- Mantenimiento** correspondiente a la Semana del 11 al 14 de Agosto del presente detallando en ellos la Actividad y el lugar de la Comisión de cada uno de los técnicos y personal a cargo de la mencionada Gerencia.

Además me permito solicitarle se dé la autorización para que se disponga la camioneta Mazda para el apoyo logístico en la instalación de los Sistemas de riego por goteo en el Proyecto de Riego Cochas- San Vicente del 11 al 14 de Agosto del presente.

Por la favorable atención desde ya le antelo mis agradecimientos

Atentamente,



Ing. Ángel Collahuazo


**GERENTE DE OPER. Y MANT.**

**JJJ/AC**  
**Archivo**  
**G.G**  
**Adjunto Cronograma.**



CUADRO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GERENCIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SEMANA 10 - 14 DE AGOSTO DE 2015.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		11	12	13	14
Actividad:	Elaboración de informes	Elaboración de informes	Elaboración de informes	Elaboración de informes	Elaboración de informes
<b>Ing. Angel Collahuazo</b>	oficina	oficina	oficina	oficina	Oficina
<b>Actividad:</b>	Apoyo logístico para la instalación de sistemas de Riego por Goleo en el S.R Cochas- San Vicente	Apoyo logístico para la instalación de sistemas de Riego por Goleo en el S.R Cochas- San Vicente	Apoyo logístico para la instalación de sistemas de Riego por Goleo en el S.R Cochas- San Vicente	Apoyo logístico para la instalación de sistemas de Riego por Goleo en el S.R Cochas- San Vicente	Apoyo logístico para la instalación de sistemas de Riego por Goleo en el S.R Cochas- San Vicente
<b>Lugar:</b>	Canton Paltas	Canton Paltas	Canton Paltas	Canton Paltas	Canton Paltas
<b>Ing. Hernán Armiños</b>	Labores de Mantenimiento al S.R Campana Malacatos	Labores de Mantenimiento al S.R Campana Malacatos	Actividades de Operación y Mantenimiento SR Quinara-Palmira	Actividades de Operación y Mantenimiento SR Campana- Malacatos	Actividades de Operación y Mantenimiento SR Campana- Malacatos
<b>Lugar:</b>	Malacatos	Malacatos	Quinara	Malacatos	Malacatos
<b>Ing. Manuel Carrión</b>	Elaboración de informes	Actividades de Operación y Mantenimiento SR. Santiago	Actividades de Operación y Mantenimiento SR. Limas - Conduríaco	Actividades de Operación y Mantenimiento SR. Jorupe- Cangochara	Actividades de Operación y Mantenimiento SR. Jorupe- Cangochara
<b>Lugar:</b>	oficina	Loja	Espíndola	Espíndola	Espíndola
<b>Sr. Ramiro Merizalde (Retroexcavadora)</b>	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo
<b>Lugar:</b>	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo
<b>Sr. Benito Gonzaga (Volqueta)</b>	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo
<b>Lugar:</b>	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo
<b>Sr. Luis Tigre (Volqueta)</b>	Transporte de material en el SR. Santiago	Transporte de material en el SR. Santiago			
<b>Lugar:</b>	Loja	Loja			

  
 Ing. Angel Collahuazo  
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO





Listado de Documentos 2015 entregados por la Jefatura: Gerencia Operación y Mantenimiento (2015/08/04)							
Nº	Origen	Doc. Nº	#Foj.	Destino	Asunto	Fecha	Responsable
9808	G.O.M	M 443	VARIAS	Gerencia General	Cronograma de comisiones de la Gerencia de Operacion- mantenimiento correspondiente a la Semana del 10 al 14 de agosto del presente	2015-08-04 09:29:00	<i>Jomara</i>
Total de documentos enviados: 1							
						[Imprimir] - [Regresar]	

*SE REPITE CRONOGRAMA  
POR FERIADO DE 10*

*Jomara  
09/08/15*



**MEMORANDO Nro. 0443- REP-GOM-2015**

**PARA** Ing. María Yolanda Mora **GERENTE GENERAL RIDRENSUR**

**DE.** Ing. Ángel Collahuazo **GERENTE DE OPER. Y MANT.**

**ASUNTO:** Cronograma de comisiones de la Gerencia de Operación –  
Mantenimiento correspondiente a la Semana del 10 al 14 de Agosto del  
presente

**FECHA:** 04 de Agosto del 2015.

Por medio del presente me permito Adjuntarle **El Cronograma de Actividades de la Gerencia de Operación- Mantenimiento** correspondiente a la Semana del 10 al 14 de Agosto del presente detallando en ellos la Actividad y el lugar de la Comisión de cada uno de los técnicos y personal a cargo de la mencionada Gerencia.

Además me permito solicitarle se dé la autorización para que se disponga la camioneta Mazda para el apoyo logístico en la instalación de los Sistemas de riego por goteo en el Proyecto de Riego Cochas- San Vicente del 10 al 14 de Agosto del presente.

Por la favorable atención desde ya le antelo mis agradecimientos

Atentamente,



Ing. Ángel Collahuazo

**GERENTE DE OPER. Y MANT.**

JJJ/AC  
Archivo  
G.G  
**Adjunto Cronograma.**

Faint, illegible text or markings on the right side of the page.



**MEMORANDO Nro. 0443- REP-GOM-2015**

**PARA** Ing. María Yolanda Mora **GERENTE GENERAL RIDRENSUR**

**DE.** Ing. Ángel Collahuazo **GERENTE DE OPER. Y MANT.**

**ASUNTO:** Cronograma de comisiones de la Gerencia de Operación –  
Mantenimiento correspondiente a la Semana del 10 al 14 de Agosto del  
presente

**FECHA:** 04 de Agosto del 2015.

Por medio del presente me permito Adjuntarle **El Cronograma de Actividades de la Gerencia de Operación- Mantenimiento** correspondiente a la Semana del 10 al 14 de Agosto del presente detallando en ellos la Actividad y el lugar de la Comisión de cada uno de los técnicos y personal a cargo de la mencionada Gerencia.

Además me permito solicitarle se dé la autorización para que se disponga la camioneta Mazda para el apoyo logístico en la instalación de los Sistemas de riego por goteo en el Proyecto de Riego Cochas- San Vicente del 10 al 14 de julio del presente.

Por la favorable atención desde ya le antelo mis agradecimientos

Atentamente,



Ing. Ángel Collahuazo

**GERENTE DE OPER. Y MANT.**

JJJ/AC

Archivo

G.G

Adjunto Cronograma.

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



CUADRO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GERENCIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SEMANA 10 - 14 DE AGOSTO DE 2015.

OPERACION Y MANTENIMIENTO		10	11	12	13	14
Ing. Angel Collahuazo	Actividad:	Elaboracion de informes	Elaboracion de informes	Elaboracion de informes	Elaboracion de informes	Elaboracion de informes
	Lugar:	oficina Canton Paltas	oficina Canton Paltas	oficina Canton Paltas	oficina Canton Paltas	Oficina Canton Paltas
Ing. Hernán Armijos	Actividad:	Apoyo logístico para la instalación de sistemas de Riego por Goteo en el S.R Cochas- San Vicente	Apoyo logístico para la instalación de sistemas de Riego por Goteo en el S.R Cochas- San Vicente	Apoyo logístico para la instalación de sistemas de Riego por Goteo en el S.R Cochas- San Vicente	Apoyo logístico para la instalación de sistemas de Riego por Goteo en el S.R Cochas- San Vicente	Apoyo logístico para la instalación de sistemas de Riego por Goteo en el S.R Cochas- San Vicente
	Lugar:	oficina Canton Paltas	oficina Canton Paltas	oficina Canton Paltas	oficina Canton Paltas	Oficina Canton Paltas
Ing. Manuel Carrión	Actividad:	Elaboracion de informes	Labores de Mantenimiento al S.R Campana Malacatos	Labores de Mantenimiento al S.R Campana Malacatos	Actividades de Operación y Mantenimiento SR Quimara-Palmira	Actividades de Operación y Mantenimiento SR Campana- Malacatos
	Lugar:	oficina	Malacatos	Malacatos	Quimara	Malacatos
Ing. Manuel Carrión	Actividad:	Elaboracion de informes	Elaboracion de informes	Actividades de Operación y Mantenimiento SR. Santiago	Actividades de Operación y Mantenimiento SR. Limas - Conduhuaco	Actividades de Operación y Mantenimiento SR. Jorupe- Cangochara
	Lugar:	oficina	oficina	Loja	Espindola	Espindola
Sr. Ramiro Merizalde (Retroexcavadora)	Actividad:	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo
	Lugar:	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo
Sr. Benito Gonzaga (Volqueta)	Actividad:	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo	Limpieza de los canales del S.R Zapotillo
	Lugar:	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo	Zapotillo
Sr. Luis Tigre (Volqueta)	Actividad:			Transporte de material en el SR. Santiago		
	Lugar:			Loja		

  
 Ing. Angel Collahuazo  
 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO





Listado de Documentos 2015 entregados por la Jefatura: Gerencia Operación y Mantenimiento (2015/08/05)							
Nº	Origen	Doc. Nº	#Foj.	Destino	Asunto	Fecha	Responsable
8183	SR. LUIS OSWALDO SAMANIEGO	M 442	1 Expediente	Gerencia General	SOLICITA SE APOYE POR PARTE DE LA EMPRESA PARA REALIZAR ARREGLOS EN EL CANAL PRINCIPAL Y SU PLATAFORMA, EN LOS DIFERENTES SECTORES, QUE HAN SUFRIDO POR EL FUERTE TEMPORAL INVERNAL Y DE IGUAL MANERA EN LAS REDES SECUNDARIAS DE LA JUNTA NRO. 4 Y 5 DEL SISTEMA DE RIEGO SANTIAGO.	2015-08-05 08:55:00	<i>J. Manríquez</i> 16/03/15
Total de documentos enviados: 1							
							[Imprimir] - [Regresar]



**EMPRESA PUBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR " RIDRENSUR "**

**ACTA DE ADJUDICACION DE INFIMA CUANTIA**

**ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS**

En la ciudad de Iaja a los 09 días del mes de Julio del 2015 y siendo las 11h45, se procede al analisis de las proformas.

**DESCRIPCION DE OFERTAS**

**DIRECCION:** GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**PROYECTO:** PLATAFORMA SISTEMA SANTIAGO

**CONVENIO:** NO

**PARTIDA:** 7.3.05.04

CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DEL ARTICULO,EQUIPO, MATERIAL	OFERENTES	
		ANGEL WILSON	LUIS BLADIMIR SAMANIEGO PONCE
100 HORAS	ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) CON OPERADOR	2100	1900
	<b>SUBTOTAL</b>	2100	1900
	<b>DESCUENTO</b>		
	<b>SUBTOTAL IVA 0%</b>		
	<b>SUBTOTAL IVA 12%</b>	2100	1900
	<b>IVA 12%</b>	252	228
	<b>TRANSPORTE</b>		
	<b>TOTAL</b>	2352	2128

**ADJUDICACION:** LUEGO DEL ANALISIS DE LAS PROFORMAS SE PROCEDIO ADJUDICAR AL SR LUIS BLADIMIR SAMANIEGO PONCE QUIEN PRESENTO MENOR VALOR EN SU PROFORMA

**ADJUDICADO :** DR. LILIA ESPINOZA  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**



**CT: 8183**

**MEMORANDO Nro. 0442- REP-GOM-2015**

**PARA:** Ing. María Yolanda Mora.  
**GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP.**

**DE:** Ing. AÑgel Collahuazo Astudillo  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

**ASUNTO:** Autorización de pago de contratación de retroexcavadora para trabajos emergentes en el sistema de riego Santiago.


**FECHA:** 04 de agosto de 2015.

De acuerdo al informe de trabajos realizados por el alquiler de la retroexcavadora para atender emergencia en el sistema de riego Santiago (memorandum Nro. 438-REP-GOM-2015), me permito hacerle conocer que gracias a la intervención oportuna de la institución, fue factible afrontar la etapa de emergencia que sufrió el sistema de riego Santiago por el fuerte temporal lluvioso que afectó principalmente la plataforma y conducción principal, logrando precautelar la infraestructura de riego.

Al concluirse con satisfacción los trabajos, me permito solicitar a su autoridad, autorice a quien corresponda para que proceda a realizar el pago por el alquiler de 100 horas de retroexcavadora, por el monto de USD \$ 2128,00 (Dólares Americanos), para ello se adjuntan los siguientes documentos habilitantes:

- Certificación presupuestaria
- Certificaciones POA Y PAC
- Dos proformas
- Cuadro comparativo
- Parte diaria de trabajos de la retroexcavadora
- Informe de trabajos realizados
- Factura

Atentamente,

  
Ing. Ángel Collahuazo Astudillo  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO**

AC/JJJ

CC: Gerencia Operación y Mantenimiento





CT: 8183

**MEMORANDO Nro. 0438- REP-GOM-2015**

**PARA:** Ing. María Yolanda Mora.  
**GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP.**

**DE:** Ing. Manuel Carrión Jiménez  
**TECNICO DE O & M RIDRENSUR EP.**

**ASUNTO:** Informe de trabajos de emergencia realizados en el sistema de riego Santiago.

**FECHA:** 03 de agosto de 2015.

Por medio del presente, muy respetuosamente me dirijo a usted para hacerle llegar la información correspondiente de los trabajos de emergencia realizados en la plataforma y canal principal del Sistema de riego Santiago, con el alquiler de 100 horas de retroexcavadora que trabajó desde el 11 al 24 de julio del presente año.

Los trabajos realizados solucionaron los problemas emergentes del sistema de riego, evitando que se produzcan daños mayores en la infraestructura de riego, principalmente en la plataforma y conducción principal.

Particular que pongo a su consideración para los fines pertinentes.

Atentamente.

VISTO BUENO

  
Ing. Manuel Carrión Jiménez  
TECNICO O & M RIDRENSUR EP

  
Ing. Ángel Collahuazo  
GERENTE DE OPER & MANT.

MHCJ  
Archivo: Personal  
GOM

Adjunto: lo indicado.







**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL ALQUILER DE  
RETROEXCAVADORA PARA ATENDER EMERGENCIA EN EL SISTEMA  
DE RIEGO SANTIAGO**

**FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:** 11-julio-2015

**FECHA DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS:** 24-julio-2015

**TECNICO RESPONSA DE LA ZONA:** Ing. Manuel Carrión Jiménez

**DÍAS TRABAJADOS:** 12 días

**TRABAJOS EJECUTADOS:**

- **Limpieza de derrumbe y de canal en el sector de la quebrada El Sayo.**

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe y del canal principal del sistema de riego (abscisas 2+200 hasta 2+300). El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*



- **Limpieza de derrumbes y de canal, además habilitación de la vía a 200 m de la entrada al primer túnel.**

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe y del canal principal del sistema de riego (abscisas 3+900 hasta 4+000), adicionalmente se rehabilito la plataforma en unos 200m. El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*





- ***Limpieza en la salida del túnel 2 y habilitación de la vía, además se deja colocando las tapas del canal.***

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe y del canal principal del sistema de riego (abscisas 5+897 hasta 6+000), adicionalmente se rehabilito la plataforma y coloco tapas de embaulado. El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*



- ***Limpieza de derrumbes y habilitación de la vía, antes de llegar a Cachipirca.***

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe y rehabilitación de la plataforma (abscisas 7+100 hasta 7+300). El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*


11





- **Limpieza de canal y de derrumbes, además habilitación de la vía a la altura del sitio Cachipirca.**

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe en canal y rehabilitación de la plataforma (abscisas 8+900 hasta 9+100). El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*

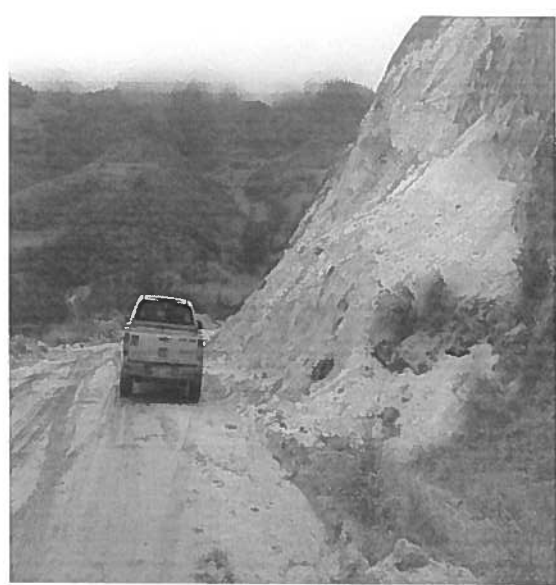


- **Limpieza de derrumbes en el sector Challipaccha, a la altura del domicilio de la Sra. Luz Villavicencio.**

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe en canal y rehabilitación de la plataforma (abscisas 15+800 hasta 16+000). El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*

11



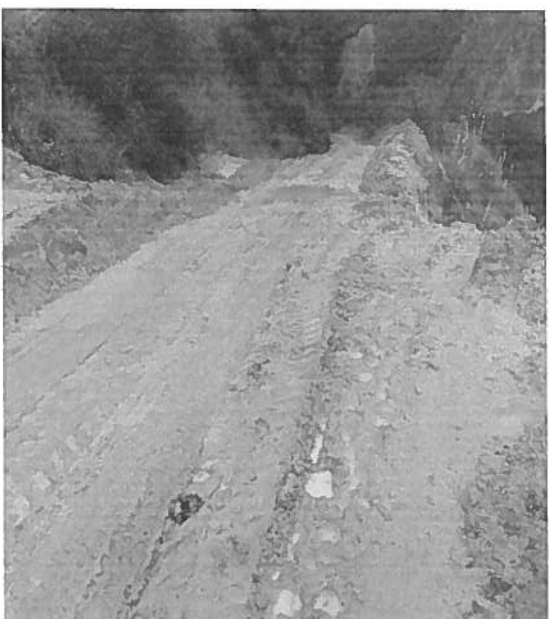

- **Limpieza de derrumbes y de canal, además apertura de la vía quitando árboles caídos, mas excavación de un pozo en la quebrada del Lirio.**

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe en canal y rehabilitación de la plataforma (abscisas 18+500 hasta 18+700). El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*



- **Habilitación del canal y limpieza de derrumbes, en el sector de Solamar Alto en la salida del túnel 3, en dirección Solamar - Zalapa.**

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe en canal y rehabilitación de la plataforma (abscisas 19+570 hasta 20+570). El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*

11

11







- **Limpieza de derrumbes, habilitación de la vía y azolve de canal a la altura de la quebrada de Solamar, además limpieza de la quebrada de Solamar.**

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe en canal y rehabilitación de la plataforma y desalojos en la quebrada Solamar (abscisas 22+500 hasta 22+650). El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*



- **Limpieza de derrumbes, azolve de canal y habilitación de la vía, por la altura del sitio Masaca Alto.**

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe en canal y rehabilitación de la plataforma (abscisas 27+000 hasta 27+300). El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*

10





- **Limpieza de derrumbe grande a la altura de la quebrada de Sevilla de Oro.**

*Se trabajo en la limpieza de derrumbe en canal y rehabilitación de la plataforma (abscisas 32+000 hasta 32+200). El avance de los trabajos que se realizó esta por el 100%.*




Atentamente.

*Manuel Carrion Jimenez*  
Ing. Manuel Carrion Jimenez  
TECNICO O & M RIDRENSUR EP

VISTO BUENO

*Angel Collahuazo*  
Ing. Ángel Collahuazo  
GERENTE DE OPER & MANT.

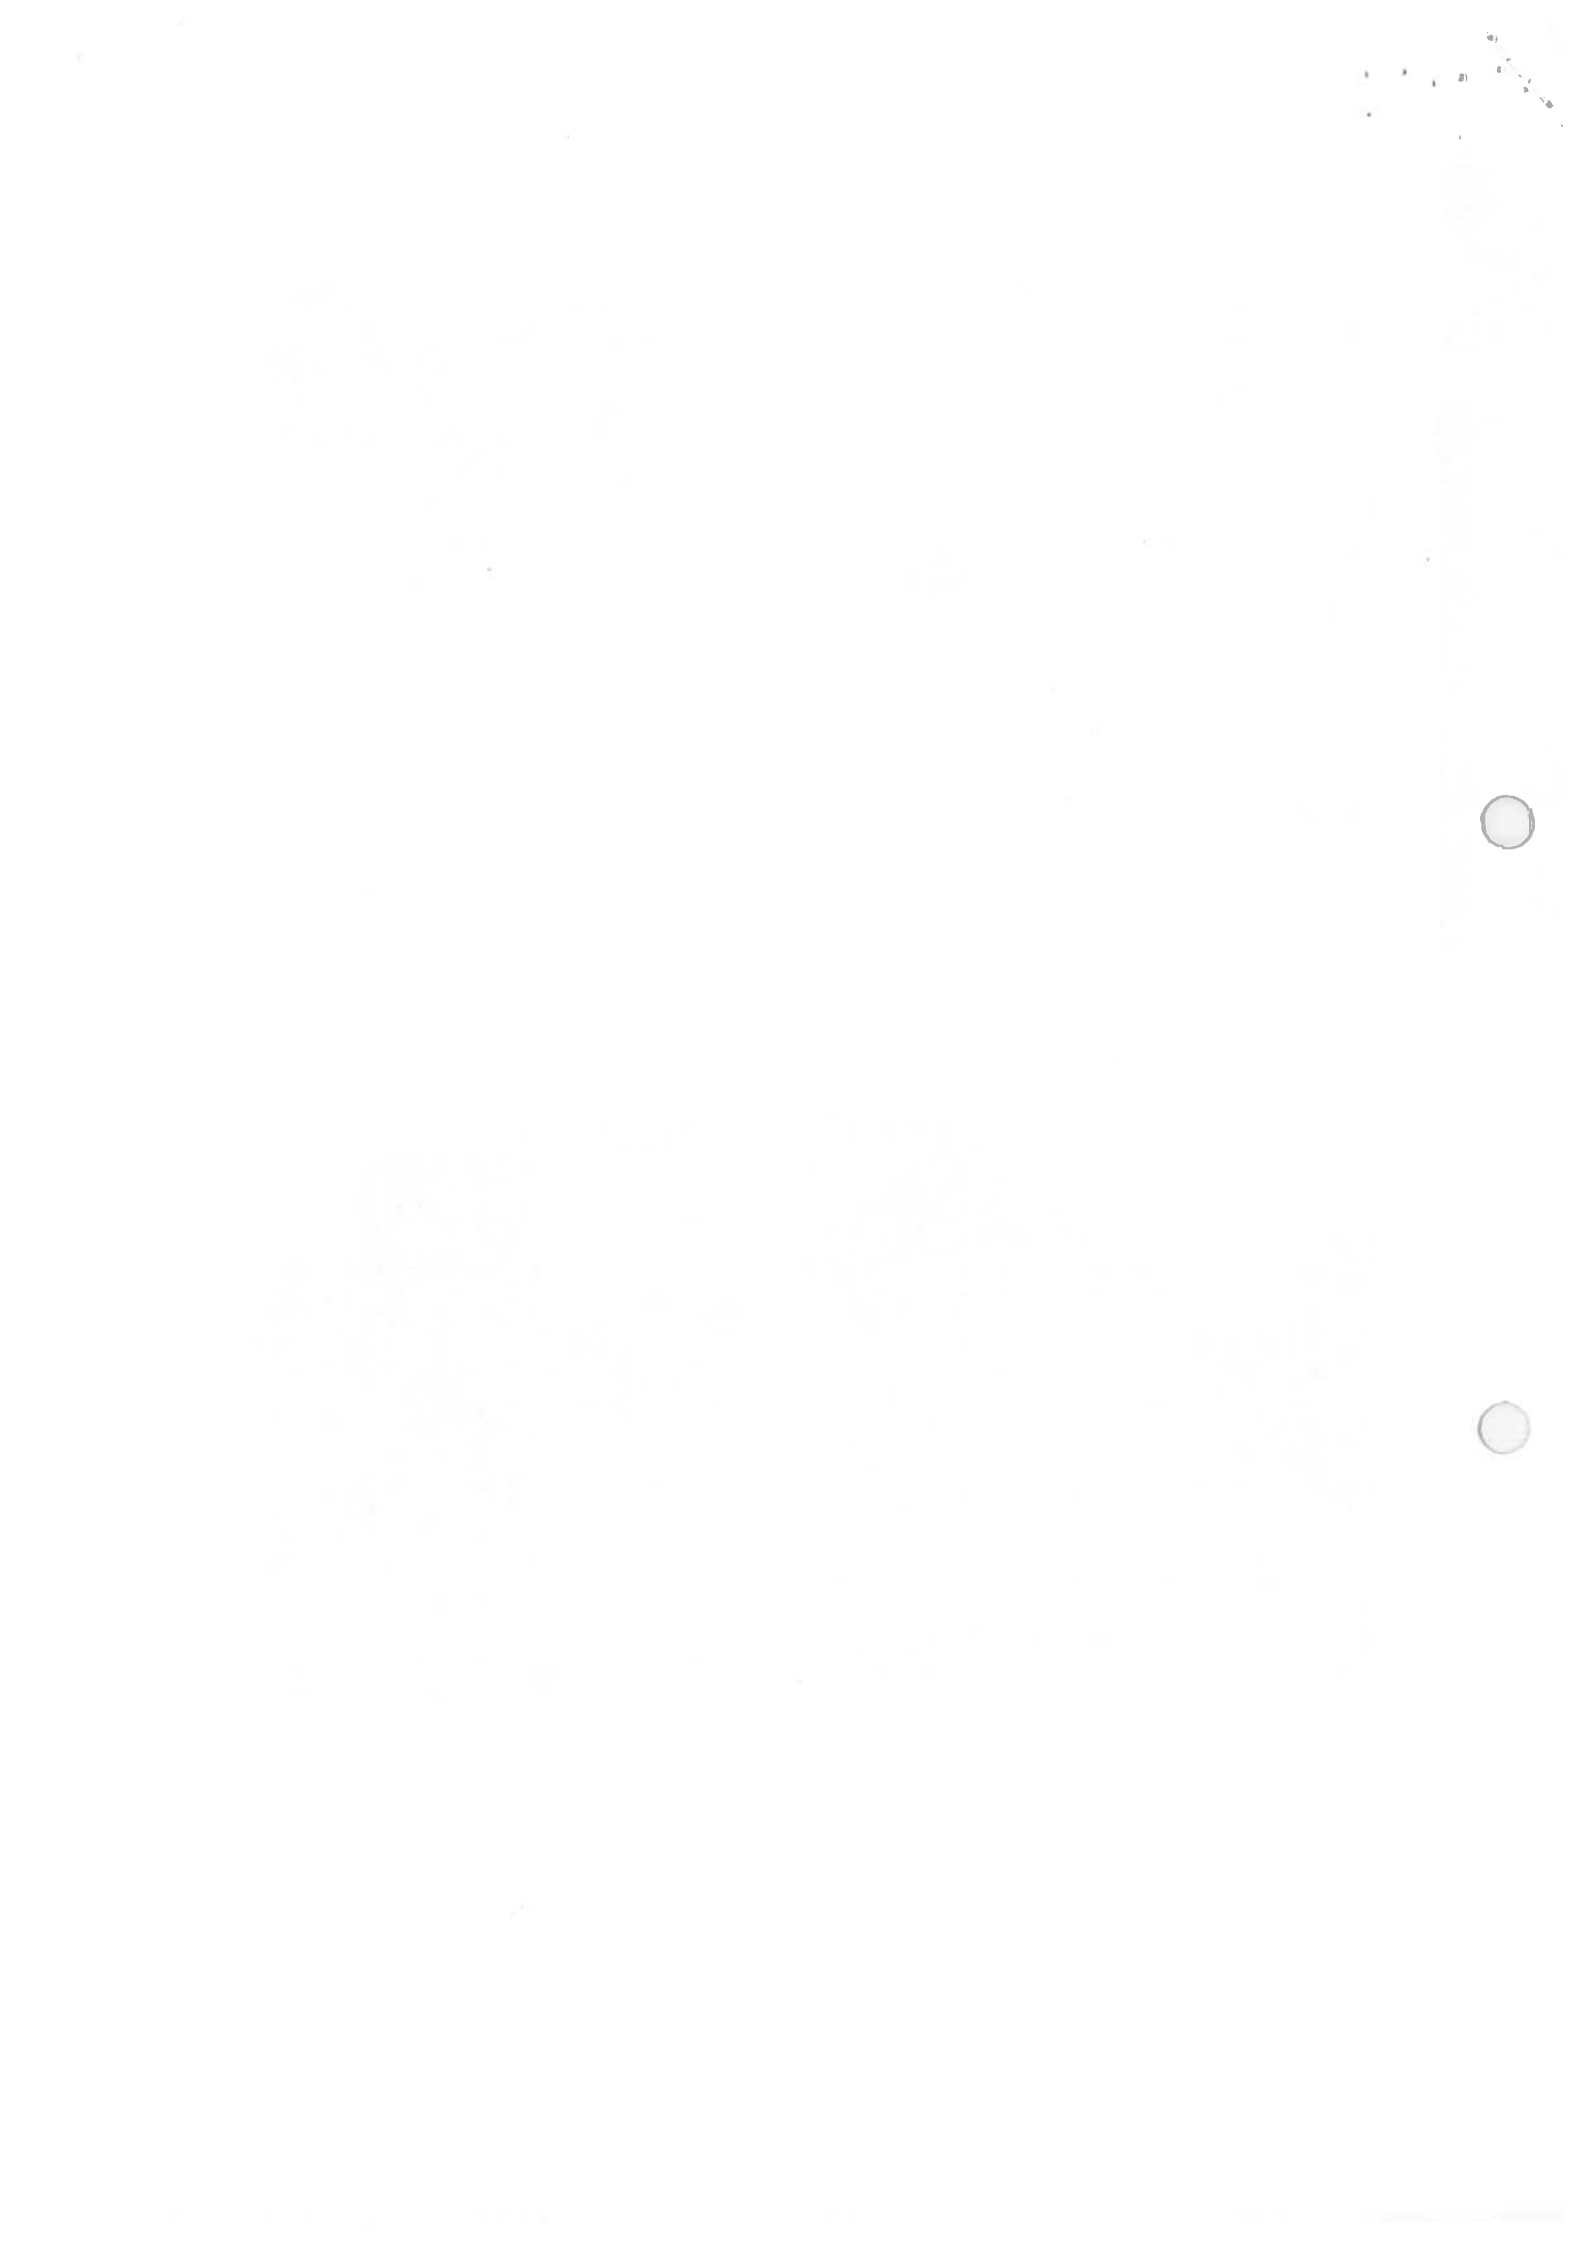

# GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

EMPRESA PÚBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR  
RIDENSUR EP.

## PARTE DIARIA DE TRABAJO DEL EQUIPO


Fecha: Sábado, 11 de julio de 2015 Proyecto: Rehab. Plataforma Sistema Santiago  
 Equipo: RETROEXCAVADORA Obra: \_\_\_\_\_  
 Código: \_\_\_\_\_ Operador: Sr. Luis Bladimir Samaniego  
 Lectura Horometro: \_\_\_\_\_ Ayudante: \_\_\_\_\_  
 Inicial: 8184.8 horas  
 Final: 8193.1 horas

HORAS	MAÑANA		TARDE		NOCHE		TOTAL HORAS
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
MAQUINA	08:00	12:00	13:00	17:18			8.3
HOMBRE							


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (DATOS A LLENAR POR EL OPERADOR Y/O CONTROLADOR)
<b>TRABAJO REALIZADO</b>
Limpieza de derrumbe y de canal en el sector de la quebrada El Sayo.

ABSCISAS	
INICIAL 2200 m	FINAL 2300 m
ÁREA: m <sup>2</sup>	RUBRO:
VOL: m <sup>3</sup>	-----

CAUSAS DE PARALIZACIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO DE PARALIZACIÓN		
	HORA DE PARALIZACIÓN	HORA DE REINICIO	TIEMPO PARADO



**OPERADOR**  
Nombre: Luis Bladimir  
Samaniego



**JEFE DE EQUIPO**  
Nombre: Ing. Manuel Carrión



**CONTROLADOR DE OBRA**  
Nombre: Luis Samaniego  
(Presidente Junta Riego)

11/11/11



# GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

EMPRESA PÚBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR

RIDENSUR EP.

## PARTE DIARIA DE TRABAJO DEL EQUIPO

**Fecha:** Lunes, 13 de julio de 2015  
**Equipo:** RETROEXCAVADORA  
**Código:** \_\_\_\_\_  
**Lectura Horometro:** \_\_\_\_\_  
**Inicial:** 8193,1 horas  
**Final:** 8200,8 horas


**Proyecto:** Rehab. Plataforma Sistema Santiago  
**Obra:** \_\_\_\_\_  
**Operador:** Sr. Hugo Bolivar Tapia Cabrera  
**Ayudante:** \_\_\_\_\_


HORAS	MAÑANA		TARDE		NOCHE		TOTAL HORAS
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
MAQUINA	08:00	12:00	13:00	16:42			7.7
HOMBRE							


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (DATOS A LLENAR POR EL OPERADOR Y/O CONTROLADOR)	
<b>TRABAJO REALIZADO</b>	
Limpieza de derrumbes y de canal, además habilitación de la vía a 200 m de la entrada al primer túnel.	

ABSCISAS			
INICIAL	3900 m	FINAL	4000 m
ÁREA:	m <sup>2</sup>	RUBRO:	
VOL:	m <sup>3</sup>		

CAUSAS DE PARALIZACIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO DE PARALIZACIÓN		
	HORA DE PARALIZACIÓN	HORA DE REINICIO	TIEMPO PARADO

  
**OPERADOR**  
**Nombre:** Luis Bladimir Samaniego

  
**JEFE DE EQUIPO**  
**Nombre:** Ing. Manuel Carrión

  
**CONTROLADOR DE OBRA**  
**Nombre:** Luis Samaniego  
 (Presidente Junta Riego)

11





# GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

## EMPRESA PÚBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR

### RIDENSUR EP.

#### PARTE DIARIA DE TRABAJO DEL EQUIPO


Fecha: <u>Martes, 14 de julio de 2015</u>	Proyecto: <u>Rehab. Plataforma Sistema Santiago</u>
Equipo: <u>RETROEXCAVADORA</u>	Obra: _____
Código: _____	Operador: <u>Sr. Hugo Bolívar Tapia Cabrera</u>
Lectura Horometro: _____	Ayudante: _____
Inicial: <u>8200.8 horas</u>	
Final: <u>8209.5 horas</u>	


HORAS	MAÑANA		TARDE		NOCHE		TOTAL HORAS
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
MAQUINA	08:00	12:00	13:00	17:42			8,7
HOMBRE							


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (DATOS A LLENAR POR EL OPERADOR Y/O CONTROLADOR)
<b>TRABAJO REALIZADO</b>
Limpeza en la salida del túnel 2 y habilitación de la vía, además se deja colocando las tapas del canal.

ABSCISAS			
INICIAL	5897 m	FINAL	6000 m
ÁREA:	m <sup>2</sup>	RUBRO:	
VOL:	m <sup>3</sup>		-----

CAUSAS DE PARALIZACIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO DE PARALIZACIÓN		
	HORA DE PARALIZACIÓN	HORA DE REINICIO	TIEMPO PARADO

  
 OPERADOR  
 Nombre: Luis Bladimir Samaniego

  
 JEFE DE EQUIPO  
 Nombre: Ing. Manuel Carrión

  
 CONTROLADOR DE OBRA  
 Nombre: Luis Samaniego  
 (Presidente Junta Riego)



# GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

EMPRESA PÚBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR

RIDENSUR EP.

## PARTE DIARIA DE TRABAJO DEL EQUIPO

**Fecha:** Miércoles, 15 de julio de 2015  
**Equipo:** RETROEXCAVADORA  
**Código:** \_\_\_\_\_  
**Lectura Horometro:** \_\_\_\_\_  
**Inicial:** 8209.5 horas  
**Final:** 8217.5 horas

**Proyecto:** Rehab. Plataforma Sistema Santiago  
**Obra:** \_\_\_\_\_  
**Operador:** Sr. Hugo Bolívar Tapia Cabrera  
**Ayudante:** \_\_\_\_\_

HORAS	MAÑANA		TARDE		NOCHE		TOTAL HORAS
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
MAQUINA	08:00	12:00	13:00	17:00			8.00
HOMBRE							

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (DATOS A LLENAR POR EL OPERADOR Y/O CONTROLADOR)
<b>TRABAJO REALIZADO</b>
Limpeza de derrumbes y habilitación de la vía, antes de llegar a Cachipirca.

ABSCISAS	
INICIAL 7100 m	FINAL 7300 m
ÁREA: m <sup>2</sup>	RUBRO: _____
VOL: m <sup>3</sup>	_____

CAUSAS DE PARALIZACIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO DE PARALIZACIÓN		
	HORA DE PARALIZACIÓN	HORA DE REINICIO	TIEMPO PARADO

**OPERADOR**  
**Nombre:** Luis Bladimir Samaniego

**JEFE DE EQUIPO**  
**Nombre:** Ing. Manuel Carrión

**CONTROLADOR DE OBRA**  
**Nombre:** Luis Samaniego (Presidente Junta Riego)













# GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

EMPRESA PÚBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR

RIDENSUR EP.

## PARTE DIARIA DE TRABAJO DEL EQUIPO


<b>Fecha:</b> <u>Sábado, 18 de julio de 2015</u> <b>Equipo:</b> <u>RETROEXCAVADORA</u> <b>Código:</b> _____ <b>Lectura Horometro:</b> _____ <b>Inicial:</b> <u>8235.0 horas</u> <b>Final:</b> <u>8243.8 horas</u>	<b>Proyecto:</b> <u>Rehab. Plataforma Sistema Santiago</u> <b>Obra:</b> _____ <b>Operador:</b> <u>Luis Bladimir Samaniego</u> <b>Ayudante:</b> _____
--	---


HORAS	MAÑANA		TARDE		NOCHE		TOTAL HORAS
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
MAQUINA	08:00	12:00	13:00	17:48			8.8
HOMBRE							


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (DATOS A LLENAR POR EL OPERADOR Y/O CONTROLADOR)
<b>TRABAJO REALIZADO</b>
Limpieza de derrumbes y de canal, además apertura de la vía quitando árboles caídos, mas excavación de un pozo en la quebrada del Lirio.

ABSCISAS			
INICIAL	18500 m	FINAL	18700 m
ÁREA:	m <sup>2</sup>	RUBRO:	
VOL:	m <sup>3</sup>		

CAUSAS DE PARALIZACIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO DE PARALIZACIÓN		
	HORA DE PARALIZACIÓN	HORA DE REINICIO	TIEMPO PARADO

  
 OPERADOR  
**Nombre:** Luis Bladimir Samaniego

  
 JEFE DE EQUIPO  
**Nombre:** Ing. Manuel Carrión

  
 CONTROLADOR DE OBRA  
**Nombre:** Luis Samaniego  
 (Presidente Junta Riego)



# GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

EMPRESA PÚBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR

RIDENSUR EP.

## PARTE DIARIA DE TRABAJO DEL EQUIPO


**Fecha:** Lunes, 20 de julio de 2015 **Proyecto:** Rehab. Plataforma Sistema Santiago  
**Equipo:** RETROEXCAVADORA **Obra:** \_\_\_\_\_  
**Código:** \_\_\_\_\_ **Operador:** Luis Bladimir Samaniego  
**Lectura Horometro:** \_\_\_\_\_ **Ayudante:** \_\_\_\_\_  
**Inicial:** 8243.8 horas  
**Final:** 8251.8 horas


HORAS	MAÑANA		TARDE		NOCHE		TOTAL HORAS
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
MAQUINA	08:00	12:00	13:00	17:00			8.0
HOMBRE							


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (DATOS A LLENAR POR EL OPERADOR Y/O CONTROLADOR)	
<b>TRABAJO REALIZADO</b>	
Habilitación del canal y limpieza de derrumbes, en el sector de Solamar Alto en la salida del túnel 3, en dirección Solamar - Zalapa.	

ABSCISAS			
<b>INICIAL</b>	19570 m	<b>FINAL</b>	20570 m
<b>ÁREA:</b>	m <sup>2</sup>	<b>RUBRO:</b>	_____
<b>VOL:</b>	m <sup>3</sup>		

CAUSAS DE PARALIZACIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO DE PARALIZACIÓN		
	HORA DE PARALIZACIÓN	HORA DE REINICIO	TIEMPO PARADO

  
**OPERADOR**  
**Nombre:** Luis Bladimir Samaniego

  
**JEFE DE EQUIPO**  
**Nombre:** Ing. Manuel Carrión

  
**CONTROLADOR DE OBRA**  
**Nombre:** Luis Samaniego  
 (Presidente Junta Riego)

100



# GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

## EMPRESA PÚBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR

### RIDENSUR EP.

#### PARTE DIARIA DE TRABAJO DEL EQUIPO


<b>Fecha:</b>	Martes, 21 de julio de 2015	<b>Proyecto:</b>	Rehab. Plataforma Sistema Santiago
<b>Equipo:</b>	RETROEXCAVADORA	<b>Obra:</b>	
<b>Código:</b>		<b>Operador:</b>	Luis Bladimir Samaniego
<b>Lectura Horometro:</b>		<b>Ayudante:</b>	
<b>Inicial:</b>	8251.8 horas		
<b>Final:</b>	8260.3 horas		


HORAS	MAÑANA		TARDE		NOCHE		TOTAL HORAS
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
MAQUINA	08:00	12:00	13:00	17:30			8.5
HOMBRE							


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (DATOS A LLENAR POR EL OPERADOR Y/O CONTROLADOR)	
<b>TRABAJO REALIZADO</b>	
Limpieza de derrumbes, habilitación de la vía y azolve de canal a la altura de la quebrada de Solamar, además limpieza de la quebrada de Solamar.	

ABSCISAS			
<b>INICIAL</b>	22500 m	<b>FINAL</b>	22650 m
<b>ÁREA:</b>	m <sup>2</sup>	<b>RUBRO:</b>	
<b>VOL:</b>	m <sup>3</sup>		

CAUSAS DE PARALIZACIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO DE PARALIZACIÓN		
	HORA DE PARALIZACIÓN	HORA DE REINICIO	TIEMPO PARADO

  
**OPERADOR**  
**Nombre:** Luis Bladimir Samaniego

  
**JEFE DE EQUIPO**  
**Nombre:** Ing. Manuel Carrión

  
**CONTROLADOR DE OBRA**  
**Nombre:** Luis Samaniego  
 (Presidente Junta Riego)



# GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

## EMPRESA PÚBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR

### RIDENSUR EP.

#### PARTE DIARIA DE TRABAJO DEL EQUIPO


Fecha: <u>Miércoles, 22 de julio de 2015</u>	Proyecto: <u>Rehab. Plataforma Sistema Santiago</u>
Equipo: <u>RETROEXCAVADORA</u>	Obra: _____
Código: _____	Operador: <u>Luis Bladimir Samaniego</u>
Lectura Horometro: _____	Ayudante: _____
Inicial: <u>8260.3 horas</u>	
Final: <u>8268.5 horas</u>	

HORAS	MAÑANA		TARDE		NOCHE		TOTAL HORAS
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
MAQUINA	08:00	12:00	13:00	17:16			8.2
HOMBRE							

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (DATOS A LLENAR POR EL OPERADOR Y/O CONTROLADOR)
<b>TRABAJO REALIZADO</b>
Limpieza de derrumbes, azolve de canal y habilitación de la vía, por la altura del sitio Masaca Alto.

ABSCISAS			
INICIAL	27000 m	FINAL	27300 m
ÁREA:	m <sup>2</sup>	RUBRO:	
VOL:	m <sup>3</sup>		

CAUSAS DE PARALIZACIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO DE PARALIZACIÓN		
	HORA DE PARALIZACIÓN	HORA DE REINICIO	TIEMPO PARADO



**OPERADOR**  
Nombre: Luis Bladimir Samaniego



**JEFE DE EQUIPO**  
Nombre: Ing. Manuel Carrión



**CONTROLADOR DE OBRA**  
Nombre: Luis Samaniego  
(Presidente Junta Riego)





# GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

EMPRESA PÚBLICA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SUR

RIDENSUR EP.

## PARTE DIARIA DE TRABAJO DEL EQUIPO


Fecha: Jueves, 23 de julio de 2015 Proyecto: Rehab. Plataforma Sistema Santiago  
 Equipo: RETROEXCAVADORA Obra: \_\_\_\_\_  
 Código: \_\_\_\_\_ Operador: Luis Bladimir Samaniego  
 Lectura Horometro: \_\_\_\_\_ Ayudante: \_\_\_\_\_  
 Inicial: 8268.5 horas  
 Final: 8276.4 horas

HORAS	MAÑANA		TARDE		NOCHE		TOTAL HORAS
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
MAQUINA	08:00	12:00	13:00	16:54			7.9
HOMBRE							

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO (DATOS A LLENAR POR EL OPERADOR Y/O CONTROLADOR)
<b>TRABAJO REALIZADO</b>
Limpieza de derrumbe grande a la altura de la quebrada de Sevilla de Oro.

ABSCISAS	
INICIAL 32000 m	FINAL 32200 m
ÁREA: m <sup>2</sup>	RUBRO:
VOL: m <sup>3</sup>	-----

CAUSAS DE PARALIZACIÓN DEL EQUIPO	TIEMPO DE PARALIZACIÓN		
	HORA DE PARALIZACIÓN	HORA DE REINICIO	TIEMPO PARADO




OPERADOR

Nombre: Luis Bladimir  
Samaniego



JEFE DE EQUIPO

Nombre: Ing. Manuel Carrión



CONTROLADOR DE OBRA

Nombre: Luis Samaniego  
(Presidente Junta Riego)

10



**MEMORANDO Nro. 441 - REP-GOM-2015**

**PARA** Ing. María Yolanda Mora **GERENTE GENERAL RIDRENSUR**

**DE.** Ing. Ángel Collahuazo **GERENTE DE OPER. Y MANT.**

**ASUNTO:** En alcance a Cronograma de comisiones de la Gerencia de Operación –Mantenimiento correspondiente a la Semana del 03 al 07 de Agosto


**FECHA:** 03 de Agosto del 2015.

En alcance a Memorando Nro. 435 –REP-GOM-2015 de fecha 28 de julio del 2015 me permito se autorice se modifique el cronograma el día 4 de agosto del presente debido a trabajos de operación y mantenimiento urgentes en el S.R Pilancay- Sacapalca- Gonzanama, ya que el mismo está próximo a inaugurarse por lo que requiere de la atención emergente, dicha comisión está a cargo del Técnico de Operación y Mantenimiento Ing. Manuel Carrión quien está a cargo del proyecto; Además solicito a usted se modifique el cronograma el día viernes 07 de agosto del presente donde se va a socializar los turnos de riego del S.R San Vicente de la Parroquia San Pedro , trabajo a cargo de mi persona, que fue planificado el viernes pasado y que no pudo ser realizado debido a calamidad domestica

Particular que pongo a conocimiento para que se den los fines pertinentes a la petición.

Por la favorable atención desde ya le antelo mis agradecimientos

Atentamente,



Ing. Ángel Collahuazo

**GERENTE DE OPER. Y MANT.**

JJJ/AC  
Archivo  
G.G

RECEPCION  
RIDRENSUR EP DE DOCUMENTOS  
Fecha: 03 AGO 2015  
Hora: 07:50  
F: Jomari

//

Blank page





## MEMORANDO N° 440-REP-GOM-2015

**PARA:** Ing. María Yolanda Mora  
**GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP**

**DE:** Ángel Collahuazo Astudillo  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

**ASUNTO:** Solicita colaboración de Asistente Administrativo a la GOM

**FECHA:** 13 de agosto de 2015

Como es de su conocimiento, el Ing. Jefferson Jaramillo, ha presentado su renuncia voluntaria a la Institución como Asistente de la Gerencia de Operación y Mantenimiento

Hasta que se contrate a la persona que ejercerá la función de **ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO** de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, me permito solicitar comedidamente, autorice a la Ing. María Torres, Asistente Administrativa de la Gerencia de Planificación, para que colabore en el ingreso y salida de los trámites que permita normar la gestión administrativa de la GOM.

Particular que le hago conocer para los fines pertinentes.

Atentamente.

Ing. Ángel Collahuazo Astudillo  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO**

AC/  
CC: Gerencia Operación y Mantenimiento

RECEPCIÓN  
DE DOCUMENTOS  
RIDRENSUR EP  
Fecha: 13/08/2015  
Hora: 09:42  
E: Jaramillo



**Listado de Documentos 2015 entregados por la Jefatura: Gerencia Operación y Mantenimiento (2015/08/17)**

N°	Origen	Doc. N°	#Foj.	Destino	Asunto	Fecha	Responsable
8749	G.O.M	M 0364- REP- GOM- 2015	1 EXP	Gerencia General	Informe Canalero Cochabamba San Vicente	2015-08-17 17:01:00	<i>pmr</i> <i>HLL</i>
Total de documentos enviados: 1							

[\[Imprimir\]](#) - [\[Regresar\]](#)

Señor

**DIRIGENTE DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNITARIO DE**

En su despacho.-

Por medio de la presente, en nombre y representación de la Red de organizaciones sociales y comunitarias en la gestión del agua del Ecuador "ROSCGAE"-Filial Región Sur, me es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente, desearle toda clase de éxitos en las labores a usted encomendadas y a la vez manifestarle lo siguiente:

La ROSCGAE es una Organización que aglutina en su seno a asociaciones de segundo grado de organizaciones comunitarias de servicios de agua para consumo humano, saneamiento y riego –OCSAS, sin fines de lucro, con autonomía propia a duración indefinida, socios ilimitados y responsabilidad limitada. Dentro de su accionar procura fortalecer a las organizaciones comunitarias de servicio de agua, saneamiento y riego del Ecuador en su gestión; como el contribuir en la gestión eficiente, eficaz y sostenible de los servicios de agua, saneamiento y riego a nivel comunitario.

Para ello, es necesario trabajar conjuntamente con las Organizaciones de base aspectos relacionados con el fortalecimiento de las capacidades locales –mediante la capacitación, fortalecer los procesos organizativos, a través de la Asociatividad a nivel parroquial, cantonal, provincial, regional y nacional, y estar en condiciones adecuadas de hacer incidencia política, para que el Estado atienda de manera oportuna a nuestros requerimientos en la gestión comunitaria del agua, en base a lo que manda la Constitución y las leyes, que son nuestros derechos inalienables e irrenunciables.


Con estos antecedentes, si las organizaciones comunitarias de agua de consumo humano y riego comunitario están adecuadamente organizadas y unidas, tendremos la suficiente fuerza para exigir al Gobierno Nacional, a través de las diferentes instituciones –GAD Parroquiales, GAD Municipales, GAD Provinciales y los diferentes ministerios que están en relación con las gestión de los recursos hídricos –SENAGUA, MAGAP, MA, de acuerdo a sus competencias-, cumplan con su responsabilidad de atender a nuestros requerimientos y apoyar en la soluciones de la problemática que está presente en los diferentes territorios del país.

Así mismo, la ROSCGAE, hace la cordial invitación a usted y a los demás miembros de su directorio, para que participen en la ASAMBLEA PROVINCIAL, que se desarrollará el día sábado, 25 de julio de 2015, a partir de las 08h30, en el Salón de Provincial, del Gobierno Provincial de Loja, ubicado en la calle Bernardo Valdivieso entre José Antonio Eguiguren y Colón.

Igualmente, la ROSCGAE, hace la invitación para que su organización que representa, se integren a la Red, en cuyo espacio trabajar colectivamente y mancomunadamente para construir propuestas, para el logro de nuestros objetivos, relacionados a promover un proceso de asociatividad cantonal y provincial, ganar unidad y fuerza e incidir ante las instituciones para que nos atiendan a nuestras demandas.

Seguro de contar con su importante participación, le expreso los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Luis Sivisaca Caraguay  
COORDINADOR ROSCGAE-REGION SUR

c.c.- Archivo

NOTA: Pueden comunicarse a la siguiente dirección electrónica: [luisivisaca@yahoo.es](mailto:luisivisaca@yahoo.es) o al celular: 0986093668 o al teléfono 3024872.



CT-8749

**MEMORANDO 0364 REP-GOM-2015**

**PARA:** Ing. María Yolanda Mora **GERENTE GENERAL DE RIDRENSUR**  
**DE:** Ing. Santos Armijos. **COORDINADOR DEL PROYECTO.**  
**ASUNTO:** Contratación de Canaiero Cochás San Vicente.  
**FECHA:** 17 de agosto del 2015.

Atendiendo a la sumilla inserta en el Memorando 790-REP-TH-2015 del trámite CT: 8749-2015, me permito solicitar de la manera más comedida se autorice a quien corresponda proceda a la contratación de una persona para que continúe cumpliendo las funciones de canaiero para el Sistema de Riego Cochás San Vicente. El plazo del contrato correrá a partir del 01 de septiembre hasta el 31 de diciembre

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente.

  
Ing. Santos Armijos Armijos  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

Visto Bueno  
  
Ing. Angel Collahuazo  
**GERENTE DE OPER & MANT.**

Copia: **Archivo Personal**  
Se adjunta trámite

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



CT: 8749-2015

MEMORANDO 790-REP-TH-2015

**PARA :** Ing, María Yolanda Mora, **GERENTE GENERAL RIDRENSUR EP.**

**DE :** Ing, Joffre Ochoa A, **RESPONSABLE DE TALENO HUMANO (e)**

**ASUNTO:** INFORME

**FECHA:** 15 de julio de 2015

En atención a sumilla inserta por su autoridad, en memorando 390-REP-GOM-2015, de fecha 13 de julio del 2015, suscrito por el Ing, Santos Armijos y Visto Bueno del Ing, Ángel Collahuazo, Gerente de Operación y Mantenimiento, donde solicitan se lo siga contratando al señor Hitler Collaguazo, se puede informar que no es procedente la renovación del contrato del señor antes mencionado, ya que posee un contrato eventual desde el 02 de marzo al 27 de agosto del 2015, en cuyo caso no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos o discontinuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.

Ing, Joffre Ochoa Aguirre.  
**RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO**  
Archivo. RIDRENSURE.P.  
Archivo personal

Ing. Santos Armijos  
solicita contratación de  
canalero, en dos  
nombrados pero que selecciono  
y autorizo al Sr. Prefecto

11/08/2015

G. Operación y Mant.  
A concurrencia  
- Si por necesidad institucional y  
dentro de los del Reg. Ochoa - San Vicente  
de autorizara la contratación de  
esta persona bajo la denominación de  
y función de Canalero, para  
autorización de Aguirre.  
15 julio 2015  
13:10

RECEPCIÓN  
DE DOCUMENTOS  
RIDRENSUR EP  
Fecha: 15/07/2015  
J. Ochoa  
F.

LOJA  
Camino al progreso

RIEGO

