

## Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
<b>Nombre de proyecto:</b>	Centros de desarrollo integral de producción agropecuaria: Lanzaca - Gonzanamá y Yamana - Paltas					
<b>Unidad Ejecutora:</b>	Centro de Desarrollo Productivo de Lanzaca y Yamana					
<b>Fecha inicio:</b>	01/01/2014	<b>Fecha fin:</b>	31/12/2014	<b>Duración:</b>	1 año	
<b>Coordinador:</b>	Dra. Martha Carrión Sari Ing. Bolívar González		<b>Técnicos - Responsables:</b>	Dra. Martha Carrión Sari - Gonzanamá Ing. Bolívar Gonzales - Paltas		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
<b>Zona(s)</b>	<b>Cantón(es)</b>	<b>Parroquia(s)</b>	<b>Barrio(s)</b>	<b>Coordenadas</b>		
1, 2, 3, 4	Paltas Gonzanamá	Yamana Gonzanamá	Yamana Lanzaca			
<b>Sector:</b>	<b>Subsector/Tipo de intervención:</b>		<b>Beneficiarios:</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>
6. Agricultura, ganadería y pesca	6.1. Desarrollo agropecuario o agroindustrial		Directos:	531	111	642
			Indirectos:	2,124	444	2,568
			<b>Total</b>	<b>2,655</b>	<b>555</b>	<b>3,210</b>
<b>Tipo de ejecución:</b>	Directa	<b>Institución:</b>	DEPROSUR EP..			
PRESUPUESTO:						
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>Aportes:</b>	<b>US %</b>	<b>%</b>			
Internas	Asignación inicial	78,553,02	13%	Asignación inicial 78553,020,00		
	Autogestión	26,181,75	4%	Autogestión 26181,750,00		
	Reformas	477,460,53	82%	Reformas 477460,530,00		
Externas	GADs	-	-	GADs -		
	Cooperación	-	-	Cooperación -		
	Otros	-	-	Otros -		
<b>Total</b>	<b>582,195,30</b>	<b>100%</b>				
META / OBJETIVOS:						
<b>Meta:</b>	Producir y comercializar productos agrícolas, pecuarios (cerdos de engorde, ensilajes, sales minerales, plántulas de café, sales minerales, etc.) certificados que permitan la transferencia de tecnología productiva a pequeños y medianos productores.					
<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Indicadores de Resultado</b>					<b>Avance Físico %</b>
<b>Fin</b>	Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de actividades agropecuarias de pequeños y medianos productores a través de procesos de transferencia de tecnología rural agropecuaria.					Al final del año, 75 productores de cerdos mejoran su producción con la introducción de pies de cría mejorados y 164 ganaderos mejoran la productividad en los hatos ganaderos con la adquisición de ensilajes y sales minerales.
<b>Propósito</b>	Proyecto integral de producción agropecuaria en los Centros de Desarrollo Productivo de Lanzaca - Gonzanamá y Yamana - Paltas fortalecido.					Al término de año 2014; se encuentran en ejecución cuatro proyectos de producción agropecuaria: producción de pies de cría de alta genética, sales minerales, ensilajes, plántulas de café y un centro demostrativo de manejo de ganado bovino.
<b>Componentes</b>		<b>Indicador</b>				<b>%</b>
C1. Programa de desarrollo agropecuario Granja Lanzaca: producción de pies de cría de cerdos, ensilajes (maíz y sorgo forrajero), sales minerales, café, cítricos fortalecido.		A diciembre de 2014, se han producido 110 pies de cría de cerdos, 1,600 bolsas de 40 kg. de ensilajes (silo de maíz) y 1,500 bolsas de 40 Kg de ensilajes (maralfalfa), 200,000 plantulas de café y 20,00 de cítricos, beneficiando a 200 ganaderos de la provincia de Loja.				94,00
C2. Centro demostrativo en sistemas de manejo de ganado bovino de leche y engorde semiestabulado desarrollado y en operación.		Al final del año, se ha implementado un centro demostrativo para el manejo de ganado bovino, beneficiando a 300 ganaderos de la provincia de Loja.				25,00
C3. Programa de desarrollo agropecuario en la Granja Yamana: producción de lechones de engorde de cerdos y tilapia repotenciado.		Al final del año, se incrementa de 19 a 60 madres de cerdas de alta genética. Al finalizar el año se han rehabilitado dos piscinas para la producción de tialapia obteniendose una producción de 8,900 lb.				68,00
C4. Manejo de animales menores (pollos, cuyes y cerdos).		Al menos 200 productores se capacitan en manejo de animales menores				60,00
<b>Avance Físico Total Proyecto</b>						<b>61,75</b>
AVANCE PRESUPUESTARIO						
<b>PRESUPUESTO US\$</b>	<b>Total</b>	<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>	
Asignación Inicial	78,553,02					
Reformas	477,460,53					
<b>Total US\$</b>	<b>556,013,55</b>	556,013,55	528,679,60	511,196,04	443,205,90	
Planificado	556,013,55	15,816,00	23,460,51	170,541,92	346,195,12	
<b>Ejecutado</b>	<b>218,844,00</b>	27,333,95	17,483,56	67,990,14	106,036,35	
% Inversión	39,36%	172,82%	74,52%	39,87%	30,63%	
Diferencia	337,169,55	-11,517,95	5,976,95	102,551,78	240,158,77	
Comprometido	<b>308,726,11</b>	77,149,58	10,149,47	221,427,06	0,00	

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas reelevantes	Acciones tomadas	Observaciones
Instalaciones y equipo porcino depreciado y no aptas a la exigencia de la nueva genética.	Se realizó una consultoría para el rediseño de las instalaciones de la Granja Yamana	Se encuentra en la fase contractual a través del portal de compras públicas.
La aprobación del presupuesto retrasó la adquisición de las nuevas cerdas para la producción de pies de cría de cerdos.	Se solicitó la adquisición de las nuevas madres reproductoras para incrementar la producción a nivel de granja.	Se adquirieron las cerdas a mediados del mes de noviembre del presente
<b>OBSERVACIONES:</b>		
Las cerdas ingresan a la granja de Yamana el 20-09-2013 y empiezan su primera fase de reproducción entre los meses de marzo y junio del 2014		
Cuatro cerdas de las 19 repitieron el celo, retrasando su ciclo su ciclo productivo en alrededor de 21 días.		
Dos de las cuatro cerdas presentaron baja tasa de concepción (dos nacidos) al momento de parto.		


#### MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registros de participantes, Informes Técnicos, Memorias fotográficas, Informes de ventas, Kardex

#### REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Centros de desarrollo integral de producción agropecuaria: Lanzaca - Gonzanamá y Yamana - Paltas

GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014

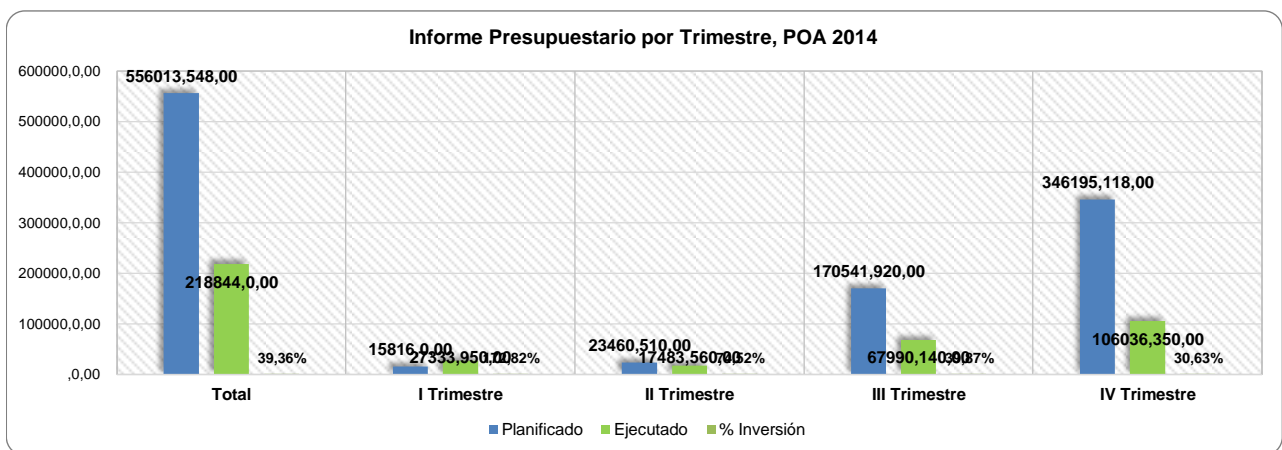

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014

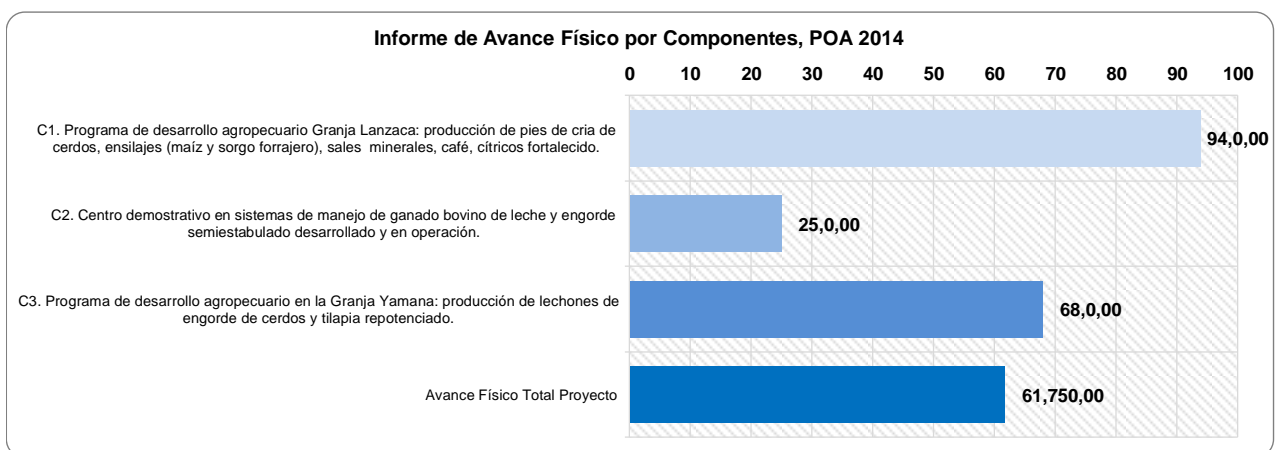

Fuente: DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014

..... Elaborado <b>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</b>	..... Revisado <b>GERENCIA TÉCNICA</b>	..... Aprobado <b>GERENCIA GENERAL</b>
--	--	--
