

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
Nombre de proyecto:		Diversificación productiva de las huertas agroforestales en la parroquia Fundochamba, cantón Quilanga.				
Unidad Ejecutora:		Unidad de apoyo a la Producción Agropecuaria				
Fecha inicio:		01/07/2014	Fecha fin:		31/03/2016	Duración: 1 año con 8 meses
Coordinador:		Ing. Servio Valverde		Técnicos - Responsables: Ing. Byron Maldonado		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
Zona(s)	Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)	Coordenadas		
1, 2, 3, 4	Quilanga	Fundochamba	Fundochamba, Naranjito, Libertad, Lalo.			
Sector:		Subsector/Tipo de intervención:		Beneficiarios:		
6. Agricultura, ganadería y pesca		6.1. Desarrollo agropecuario o agroindustrial		Directos:	88	28
				Indirectos:	352	112
				Total	440	140
						580
Tipo de ejecución:		Institución:		MAGAP-Plan de Buen Vivir, Café Cacao, RIDRENSUR EP., VIALSUR EP., DEPROSUR EP., GPL (Gestión Ambiental y Desarrollo Comunitario).		
Convenio de cooperación interinstitucional						
PRESUPUESTO:						
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%	0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000		
Internas	Asignación inicial	-	-	Asignación inicial		
	Autogestión	-	-	Autogestión		
	Reformas	21,613,03	9%	Reformas 21613,030,00		
Externas	GADs	-	-	GADs		
	Cooperación	-	-	Cooperación		
	Otros	212,625,51	91%	Otros 212625,513,33		
Total		234,238,54	100%			
META / OBJETIVOS:						
Meta: Al final del proyecto, se ha establecido 49.3 ha de café asociado con especies de sombra.						
Resumen Narrativo		Indicadores de Resultado				Avance Físico %
Fin						
Contribuir al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina desde una perspectiva integral y articulada en los aspectos organizativos, técnicos, económicos, sociales y ambientales.		Al final del proyecto, 116 familias están capacitadas y fortalecidas en procesos productivos, organizativos para el manejo de finca agroforestal.				
Propósito						
Productividad de fincas agroforestales diversificada en la parroquia Fundochamba, mejorando la seguridad alimentaria de las familias participantes.		Al final del proyecto, 116 familias mejoran sus capacidades productivas para el manejo de 49 fincas agroforestales con la implementación de riego presurizado en 49.9 ha.				11,50
Componentes		Indicador				%
C1. Programa de capacitación en manejo de huertos agroforestales ejecutado.		Al final del año, se ha capacitado al 70% de familias en el manejo de huertos agroforestales con la implementación de tecnología de riego presurizado.				41,00
C2. Parcelas demostrativas de café diversificadas en asociación con especies de sombra.		Al término del proyecto, se han implementado 43.5 ha de café en asocio con especies de sombra con riego presurizado beneficiando a 116 familias de la zona de intervención.				5,00
C3. Sistemas de comercialización asociativa de café mejorado.		Al final del proyecto, el 70% de la producción de café se comercializa a través de las asociaciones del área de intervención (PROCAFEC, EL COLMENAR y FUNDOCHAMBA).				-
Avance Físico Total Proyecto					15,33	
AVANCE PRESUPUESTARIO						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Asignación Inicial	0,00					
Reformas	21,613,03					
Total US\$	21,613,03	21,613,03	21,613,03	21,613,03	20,070,55	
Planificado	21,613,03	0,00	0,00	10,806,52	10,806,52	
Ejecutado	4,920,77	0,00	0,00	1,542,48	3,378,29	
% Inversión	22,77%			14,27%	31,26%	
Diferencia	16,692,26	0,00	0,00	9,264,04	7,428,23	
Comprometido	5,106,16	0,00	0,00	0,00	5,106,16	
PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS						
Problemas reelevantes		Acciones tomadas		Observaciones		
No existe compromiso por parte de los beneficiarios del proyecto para realizar el aporte económico, materiales y mano de obra (US\$ 2.932.14)		Se comunica en forma verbal al Gerente Técnico sobre el particular		El Técnico encargado ha mantenido reuniones con la presidenta de la Entidad Ejecutora para tomar acciones inmediatas.		
Retrazo en el inicio del proyecto en la fecha prevista por problemas de carácter administrativo de la Entidad Ejecutora.		Se comunica de manera verbal a la máxima autoridad sobre el retraso de actividades en el proyecto.		Se estan definiendo acciones con la entidad ejecutora y Coordinador de proyecto para gestionar el apoyo económico al ente financiero del Plan del Buen Vivir para lograr cofinanciamiento a los beneficiarios.		

OBSERVACIONES:

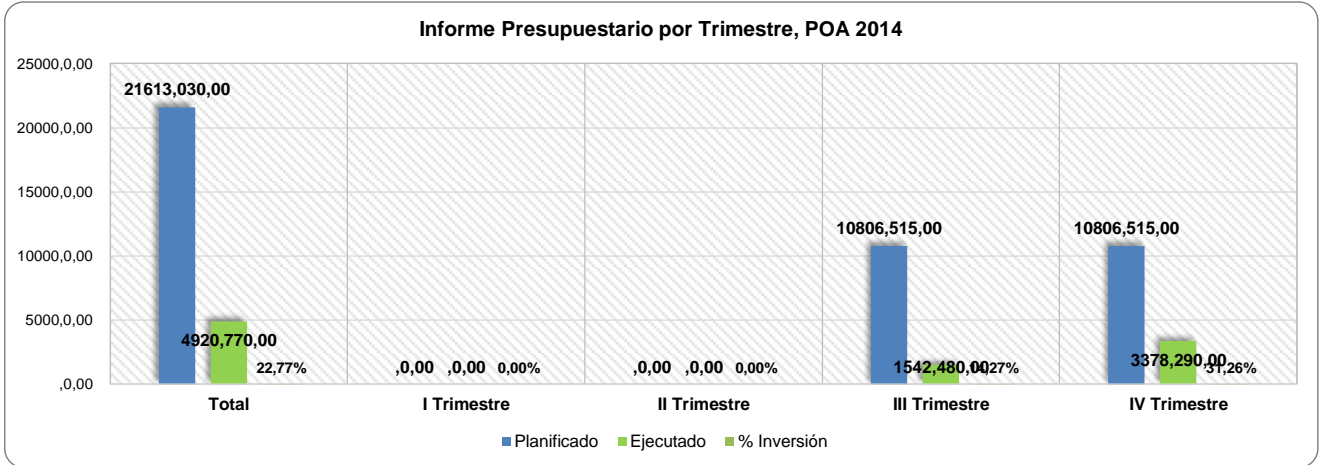
Se deberá establecer acciones para lograr la participación de los beneficiarios en la coejecución del proyecto.
El componente 2, depende de la entrega de material vegetativo (plántulas de café) del MAGAP compromiso inserto en el convenio y en el proyecto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

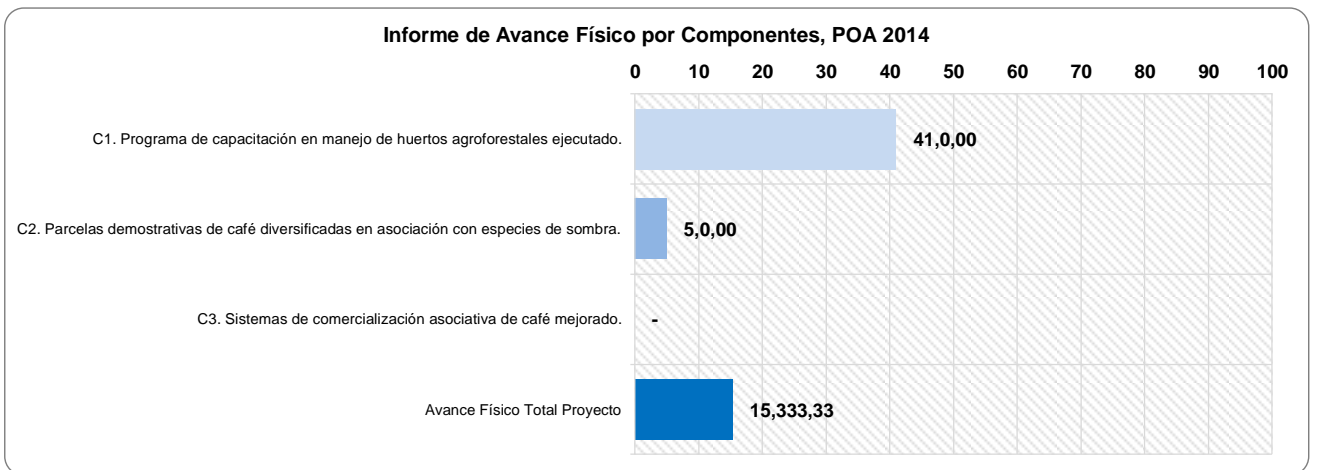
Informes técnicos, Registros de participantes, Material de capacitación digital

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Diversificación productiva de las huertas agroforestales en la parroquia Fundochamba, cantón Quilanga.

GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014

Fuente: DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014

<p>.....</p> <p>Elaborado</p> <p>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</p>	<p>.....</p> <p>Revisado</p> <p>GERENCIA TÉCNICA</p>	<p>.....</p> <p>Aprobado</p> <p>GERENCIA GENERAL</p>
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------
