

## Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:																														
<b>Nombre de proyecto:</b>	Fomento y tecnificación de la producción sana de alimentos, con un enfoque de conservación de la cuenca hidrográfica del sistema de riego Las Cochas- San Vicente, parroquia Lourdes, Cantón Paltas																													
<b>Unidad Ejecutora:</b>	Unidad de apoyo a la Producción Agropecuaria																													
<b>Fecha inicio:</b>	01/07/2014	<b>Fecha fin:</b>	31/03/2016	<b>Duración:</b>	1 año con 8 meses																									
<b>Coordinador:</b>	Ing. Servio Valverde		<b>Técnicos - Responsables:</b>	Ing. Agrop. Vicente Cobos																										
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN																														
<b>Zona(s)</b>	<b>Cantón(es)</b>	<b>Parroquia(s)</b>	<b>Barrio(s)</b>	<b>Coordenadas</b>																										
1, 2, 3, 4	Paltas	Lourdes	Las Cochas - San Vicente del Río																											
<b>Sector:</b>	<b>Subsector/Tipo de intervención:</b>		<b>Beneficiarios:</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>	<b>Total</b>																								
6. Agricultura, ganadería y pesca	6.1. Desarrollo agropecuario o agroindustrial		Directos:	110	21	131																								
			Indirectos:	440	84	524																								
			<b>Total</b>	<b>550</b>	<b>105</b>	<b>655</b>																								
<b>Tipo de ejecución:</b>	Convenio de cooperación interinstitucional	<b>Institución:</b>	MAGAP-Plan de Buen Vivir, RIDRENSUR EP. VIALSUR EP. HEIFER, Prefectura de Loja (Gestión Ambiental - Desarrollo Comunitario).																											
PRESUPUESTO:																														
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	<b>Aportes:</b>	<b>US %</b>	<b>%</b>	<table border="1" style="display: none;"> <thead> <tr> <th>Fuente</th> <th>Aporte (US\$)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Internas - Asignación inicial</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Internas - Autogestión</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Internas - Reformas</td> <td>13,273.69</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Externas - GADs</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Externas - Cooperación</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Externas - Otros</td> <td>704,426.00</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>717,699.69</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>			Fuente	Aporte (US\$)	%	Internas - Asignación inicial	-	-	Internas - Autogestión	-	-	Internas - Reformas	13,273.69	2%	Externas - GADs	-	-	Externas - Cooperación	-	-	Externas - Otros	704,426.00	98%	<b>Total</b>	<b>717,699.69</b>	<b>100%</b>
Fuente	Aporte (US\$)	%																												
Internas - Asignación inicial	-	-																												
Internas - Autogestión	-	-																												
Internas - Reformas	13,273.69	2%																												
Externas - GADs	-	-																												
Externas - Cooperación	-	-																												
Externas - Otros	704,426.00	98%																												
<b>Total</b>	<b>717,699.69</b>	<b>100%</b>																												
<b>Internas</b>	Asignación inicial	-	-	-																										
	Autogestión	-	-	-																										
	Reformas	13,273.69	2%	13273,690,00																										
<b>Externas</b>	GADs	-	-	-																										
	Cooperación	-	-	-																										
	Otros	704,426.00	98%	704426,00																										
	<b>Total</b>	<b>717,699.69</b>	<b>100%</b>																											
META / OBJETIVOS:																														
<b>Meta:</b>	Al final del proyecto se incrementa la productividad del cultivo de maíz a 100 qq/ha y maní 25 qq/ha por ciclo productivo.																													
<b>Resumen Narrativo</b>					<b>Indicadores de Resultado</b>	<b>Avance Físico %</b>																								
<b>Fin</b>	Incremento de los ingresos económicos por medio de la tecnificación de la producción agroecológica de las familias del sistema de riego Las Cochas - San Vicente.				Al término del proyecto, se ha mejorado los ingresos de 131 familiares en un 10%, por incremento de la productividad en la producción maíz y maní.																									
<b>Propósito</b>	Tecnificación de la producción de hortalizas, maíz y maní con un enfoque de conservación de la cuenca hidrográfica del sistema de riego Las Cochas- San Vicente, parroquia Lourdes, Cantón Paltas.				Al finalizar el proyecto, 131 familias mejoran sus condiciones agro productivas e incrementan en un 20% el rendimiento de los cultivos identificados (hortalizas, maíz y maní) por ha sembrada.	<b>21,67</b>																								
<b>Componentes</b>		<b>Indicador</b>			<b>%</b>																									
C1. Programa de capacitación en agricultura orgánica desarrollado.		Al final del año, se ha capacitado al 70% de las familias beneficiarias en el manejo de cultivos de ciclo corto con fertiriego y riego por surcos.			40,00																									
C2. Parcelas demostrativas de hortalizas, maíz y maní implementadas.		Al término del proyecto se ha implementado 2,000 m2 de hortalizas, 30 ha de cultivos de ciclo corto con fertiriego y 15.5 ha con riego por surcos beneficiando a 131 familias del área de intervención.			25,00																									
C3. Sistema de comercialización de hortalizas, maíz y maní fortalecidas.		Al término del proyecto, el 70% de la producción de hortalizas, maíz y maní se comercializan de manera asociativa en mercados locales.			0,00																									
<b>Avance Físico Total Proyecto</b>					<b>21,67</b>																									
AVANCE PRESUPUESTARIO																														
<b>PRESUPUESTO US\$</b>	<b>Total</b>	<b>I Trimestre</b>	<b>II Trimestre</b>	<b>III Trimestre</b>	<b>IV Trimestre</b>																									
<b>Asignación Inicial</b>	0,00																													
<b>Reformas</b>	13,273.69																													
<b>Total US\$</b>	<b>13,273.69</b>	13,273.69	13,273.69	13,273.69	13,273.69																									
Planificado	13,273.69	0,00	0,00	6,636.85	6,636.85																									
<b>Ejecutado</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																									
% Inversión	0,00%			0,00%	0,00%																									
Diferencia	13,273.69	0,00	0,00	6,636.85	6,636.85																									
Comprometido	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00																									

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas reelevantes	Acciones tomadas	Observaciones
En los primeros meses no existe una coordinación entre el Técnico externo del proyecto e instituciones coejecutoras; ocasionando retraso en el inicio del proyecto.	Se realizaron cuatro reuniones entre el Comité de Gestión y los representantes de las instituciones participantes para establecer acuerdos para inicio de proyecto.	A los siete meses de iniciado el proyecto se establecen acuerdos para inicio de proyecto en el mes de octubre.
El presupuesto inicial establecido por el Plan del Buen Vivir en sus componentes: riego, producción, asociatividad, etc. no permitió iniciar las actividades previstas.	DEPROSUR EP. a través de la Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, actualiza el presupuesto en el componente productivo, lo que incide en la reducción de las actividades previstas.	Se reestructuró los componentes productivo y riego para ajustarlo a los nuevos presupuestos.
Se reduce el presupuesto establecido para la implementación de 2.69 ha de hortalizas a una superficie de 2,000 m <sup>2</sup> distribuidos en las cuatro juntas sectoriales.	Se elabora una nueva propuesta por parte de DEPROSUR EP. para la producción de hortalizas en parcelas demostrativas y cultivo de maíz y maní en cinco Juntas Sectoriales.	La propuesta presentada por DEPROSUR EP. cuenta con la aprobación del equipo técnico de las entidades cooperantes.
<b>OBSERVACIONES:</b>		
La Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, establece una programación para el inicio de las actividades inherentes al componente productivo. Existe un desinterés de alrededor del 85% por parte de los beneficiarios (11 familias) para continuar con la ejecución del proyecto. Se deberá establecer charlas de motivación con los beneficiarios para la continuación del proyecto y/o identificar nuevos beneficiarios.		


#### MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Actas de reuniones del Comité de Gestión, Propuesta para la producción de hortalizas, Actualización presupuesto del componente productivo. Cronograma de actividades (reprogramado)

#### REPRESENTACIÓN GRÁFICA


**Fomento y tecnificación de la producción sana de alimentos, con un enfoque de conservación de la cuenca hidrográfica del sistema de riego Las Cochas- San Vicente, parroquia Lourdes, Cantón Paltas**

**GRAFICO 1: Informe Presupuestario por Trimestre, POA 2014**

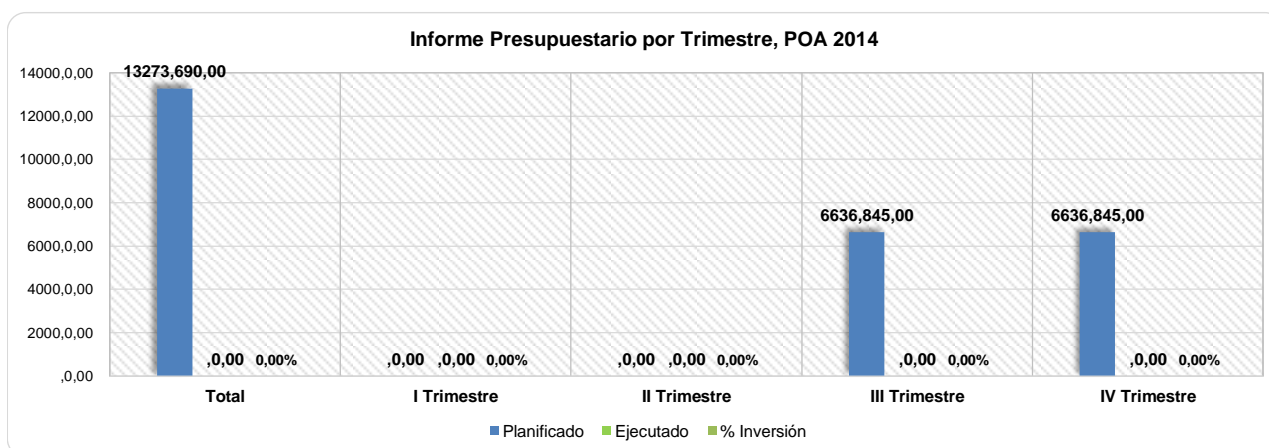

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, septiembre 2014

**GRAFICO 2: Informe de Avance Físico por Componentes, POA 2014**

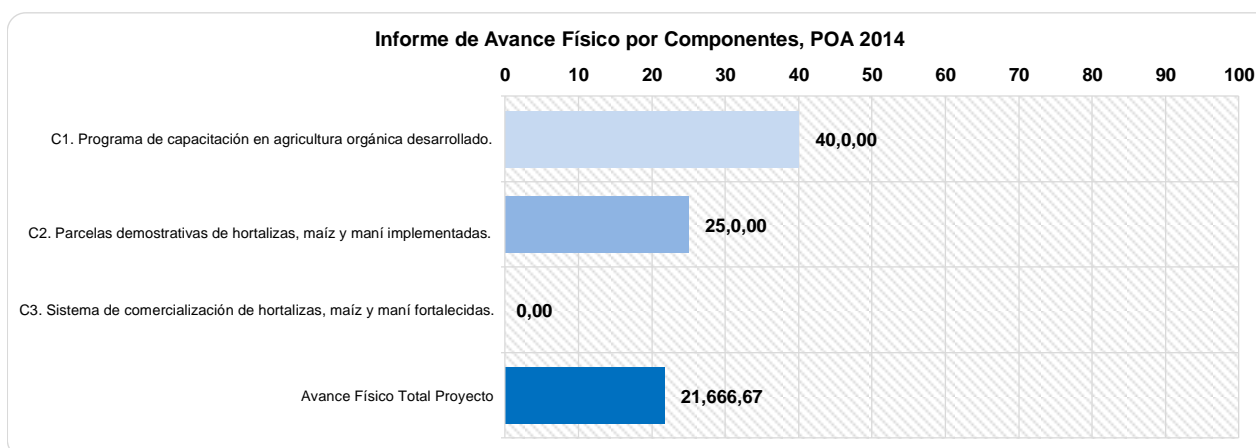

Fuente: DEPROSUR EP. Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2014

..... Elaborado <b>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</b>	..... Revisado <b>GERENCIA TÉCNICA</b>	..... Aprobado <b>GERENCIA GENERAL</b>
--	--	--
