

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:					
Nombre de proyecto:	Mejoramiento de los sistemas productivos agrícolas de los pequeños y medianos productores de la provincia de Loja con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas				
Fecha inicio:	01/01/2015	Fecha fin:	31/12/2019	Duración:	1 año
Unidad Ejecutora:	Gerencia Técnica Unidad de apoyo a la Producción Agropecuaria				
Coordinador:	Ing. Jorge Oswaldo Rojas Merchán	Técnicos - Responsables:	Ing. Servio Alejandro Valverde Cuenca Ing. Gabriela Estefanía Loaiza Silva, Ing. Byron Fidel Castro Quizhpe, Ing. Darwin Patricio Bravo Torres, Ing. Cristian Javier Díaz Quichimbo (Marzo) Ing. Ana Cecilia Ojeda Rodríguez (Octubre)		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN					
Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)		Coordenadas	
Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Gonzanamá, Loja, Macara, Saraguro, Olmedo, Paltas, Quilanga, Saraguro, Zapotillo.	Carigan, Casanga, Catacocha, Catamayo, Changaimina, Chuquiribamba, Cruzpamba, El Cisne, El Valle, Fundochamba, Garza Real, Lluzhapa, Macará, Malacatos, Nambacola, Paraíso de Celen, Purunuma, Quinara, Sacapalca, San Antonio de Cumbe, San Lucas, San Pedro, Santa Rufina, Taquil, Tuncarta, Urdaneta, Utuana, Vilcabamba, Zapotillo,	Nangora, San Fernando, Vía a Yacuambi, Tuncarta Bajo, Tuchin, Tuncarta Alto, Chuquiribamba, La Vega, La Vega Grande, Suro Bajo, Tumbunuma, La Ceiba, Huasimo, Catamahillo, Badial, Huatara/badila, La Ceiba, Pizarrón, El Coco, Coamine, La Algarrobera, Limón, Trapichillo, Y de Guineo, Sta. Rufina, San Pedro, Carigan, Zalapa, Sotopamba, Chiquil, Chandel, Azafrán, Verdillas, La Loma, 3 de Mayo, Lluzhapa, Comuna Bucashi, Shucos, Sañe, Pordel, Daniel Alvarez, San Pedro Mártir, El Pico, Patuco, San Jacinto, Zalapa, Turupamba, Llazhipa, El Naranjo, Guaruyunuma, Fundochamba, Tuchin, Potrerillos, Belén, Macandamine, Azafrán, Verdilla, La Loma, Lluzhapa, Comuna Bucashi, Shucos, Daniel Alvarez, Patuco, San Jacinto, Salapa, Turupamba, Llazhipa, El Naranjo, Guaruyunuma, Fundochamba, Cucanamá, Tumianuma, Cucanamá, Quinara, Quinara Alto, San Francisco, Comuna Bucashi, Carigan Norte, La Loma, San Agustín, Centro, Miraflores, Rodadero, Shucos Bajo, Amable María, Sañe			
Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total		
Directos:	82	129	211		
Indirectos:	328	516	844		
Total	410	645	1.055		
Tipo de ejecución:	Directa	Institución	0		
PRESUPUESTO:					
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%		
Internas	Asignación inicial	156.871,58	100%	156.871,58	
	Autogestión				
	Reformas				
Externas	GADs				
	Cooperación				
	Otros				
Total		156.871,58			
META / OBJETIVOS:					
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado			Avance	
Fin					
Contribuir a mejorar la calidad de vida de productores agrícolas mejorando los sistemas de producción primaria de la provincia de Loja.	Al finalizar el proyecto, 5,823 familias productoras de maíz, arroz, fréjol, yuca, papa, caña de azúcar y hortalizas mejoran sus ingresos económicos en un promedio de 150% por el incremento de los volúmenes de producción por ciclo productivo.				
Propósito					
Mejoramiento de los sistemas productivos agrícolas de pequeños y medianos productores de la Provincia de Loja con enfoque de BPM..	Al final del proyecto, 5,823 familias incrementan su productividad en los cultivos de: - Maíz, 66.67% (60 qq a 100 qq); - Arroz, 25.00% (120 qq a 150 qq); - Frejol, 66.67% (18 a 30 qq/ha); - Yuca, 66.67% (150 qq a 250 qq/ha); - Papa, 700% (50 qq a 400 qq/ha); - Caña de azúcar, 33.33% (60 Tn a 80 Tn/ha) - Hortalizas incrementan su área de producción de (50 m2 a 1000 m2).			74,50	
Componentes	Indicador			%	
C1. Capacidad asociativa y de gestión comunitaria fortalecida.	Al finalizar el año 2016; 532 productores mejoran sus capacidades productivas, asociativas y de gestión comunitaria para el manejo técnico de productos agrícolas priorizados en los sectores de intervención.			67,07	
C2. Buenas Practicas Agrícolas, implementadas en los cultivos de maíz, arroz, yuca, papa, caña de azúcar, fréjol y hortalizas, Pitahaya, y Camote.	Al final del año 2016, el 75% (534 productores) de las familias beneficiarias, aplican el enfoque de buenas prácticas agrícolas en los cultivos de: - Maíz, 120 ha. (6 parcelas demostrativas maíz amarillo y blanco (30 beneficiarios) - Frejol, 20 ha. (20 beneficiarios) - Arroz, 48 ha. (48 productores) - Yuca, 40 ha. (40 productores) - Papa, 40 ha. (40 productores) - Caña de azúcar, 20 ha. (30 productores) - Hortalizas, 5 ha. (280 productores) - Plantas medicinales 2 ha. (46 productores) - Pitahaya, 1 ha. (1 parcela demostrativa) - Camote 1 ha. (1 parcela demostrativa)			83,42	

C3. Sistemas de comercialización asociativo permite el acceso a mercados a pequeños y medianos productores.	Al término del proyecto se ha mejorado los sistemas de comercialización de los productores de maíz, arroz y hortalizas, garantizando precios justos.	73,01
Avance Físico Total Proyecto		74,50

AVANCE PRESUPUESTARIO					
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Codificado	156.871,58				
Reformas	0,00				
Total US\$	156.871,58				
Planificado	156.871,58	41.600,19	63.259,94	26.915,91	25.095,54
Devengado	118.010,69	11.272,14	55.570,73	25.481,46	25.686,36
Ejecución					
Presupuestaria %	75,23	27,10	87,85	94,67	102,35
% Acumulado	75,23	7,19	35,42	16,24	16,37
Saldo por Devengar	38.860,89				


PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
I Trimestre		
		No se registran datos de georeferenciación de huertos agroecológicos.
II Trimestre		
C1: No existe coordinación con los técnicos responsables del Fortalecimiento de Economía Popular y Solidaria, por superar su carga de trabajo. C2. No se ha designado técnicos responsables para la implementación de parcelas demostrativas en: caña de azúcar, camote y pitahaya. C3. No se designado un técnico responsable para apoyo en temas de comercialización.	C1. Se ha solicitado a Gerencia Técnica la gestión para el apoyo de la Unidad de Economía Popular y Solidaria. C2. Se ha conversado de manera verbal solicitando delegar técnicos para el cumplimiento de las actividades. C3. Se solicitó la designación de un técnico para el apoyo en temas de comercialización.	Se esta brindando asistencia técnica en otros cultivos: mora, brócoli, fresa y maracuyá que no están definidos en la planificación operativa.
III Trimestre		
En la implementación de parcelas demostrativas de maíz canguil, no se seleccionó adecuadamente los beneficiarios, lo que provocó la pérdida de los insumos (semilla) destinados a la producción. En la implementación de parcelas de frejol no se realizó una selección adecuada de beneficiarios provocando la pérdida total de la producción por abandono por parte del productor.	Se realizó el reclamo formal al proveedor de la semilla y al técnico responsable de la implementación de parcelas. Se notificó de manera formal a la presidenta de la Fundación Sumak Kawsay Sra. Rosa Quizhpe que debido a la falta de colaboración no se podrá realizar intervenciones futuras.	Se espera la devolución de semillas por parte del proveedor (50 kg. de maíz canguil).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Componente 1	Registro de campo; informes de seguimiento y avance.
Componente 2	Informes técnicos, Registros de campo, Registros de participantes
Componente 3	Informes técnicos, Ferias de promoción, Registros de participantes.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Mejoramiento de los sistemas productivos agrícolas de los pequeños y medianos productores de la provincia de Loja con enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016

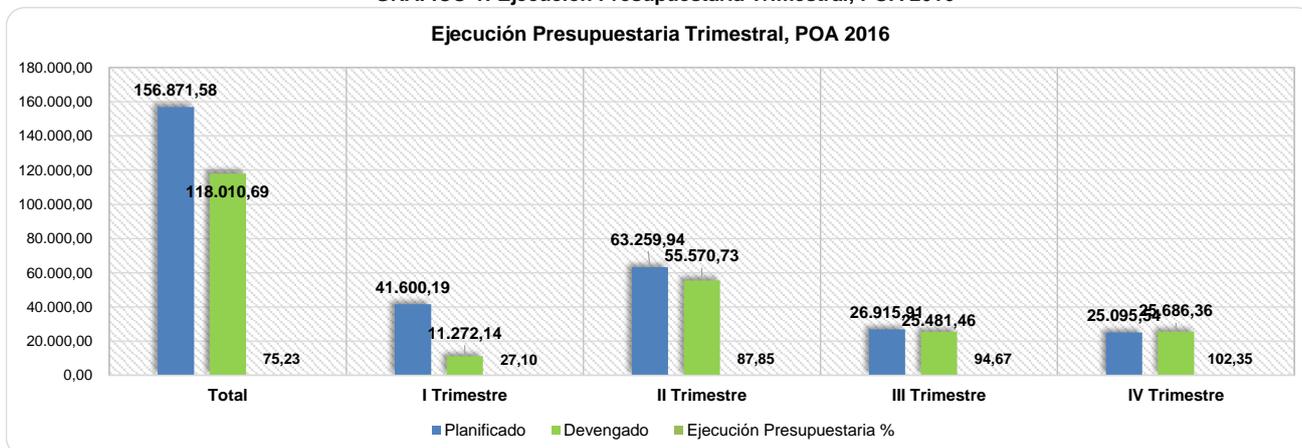

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016

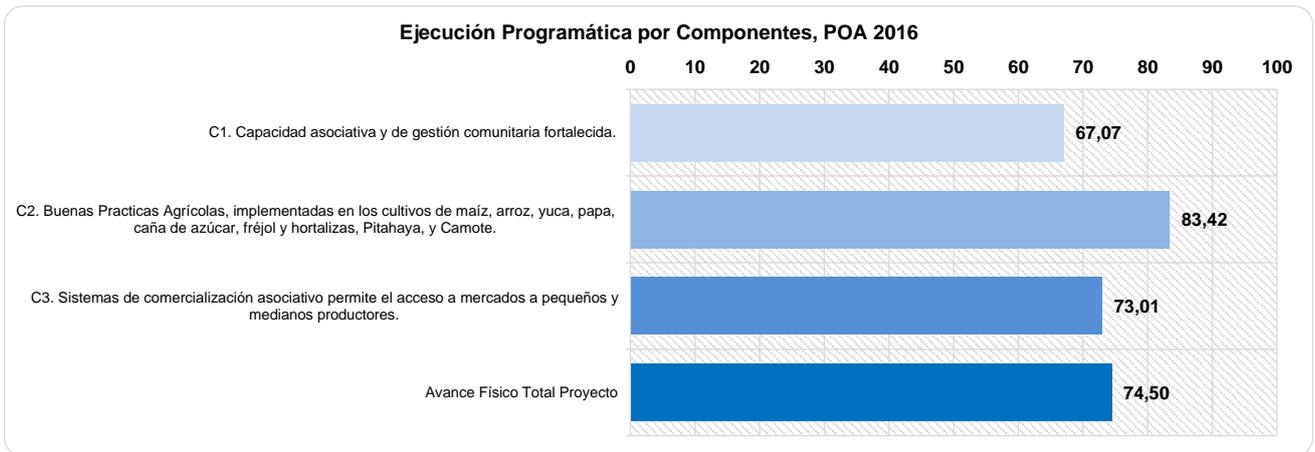

Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

..... Elaborado ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN Revisado GERENCIA TÉCNICA Aprobado GERENCIA GENERAL
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------
