

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
Nombre de proyecto:	Buenas Prácticas de Manufactura, generación de valor y certificación de productos en Centros de Desarrollo Productivo DEPROSUR EP. y Asociaciones Agroalimentarias en la provincia de Loja.					
Fecha inicio:	01/01/2015	Fecha fin:	31/12/2016	Duración:	1 año	
Unidad Ejecutora:	Gerencia Técnica Unidad de Transformación Productiva					
Coordinador:	Ing. Ind. Agrp. Mónica Alexandra Granda Encalada		Técnicos - Responsables:	Ing. Mónica Alexandra Granda Encalada		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)			Coordenadas	
Calvas, Celica, Chaguarpamba, Gonzanamá, Loja, Macará, Paltas, Puyango, Saraguro, Zapotillo	Alamor, Cariamanga, Celica, Chaguarpamba, Chuquiribamba, El Valle, Garza Real, Gonzanamá, Guachanama, Lauro Guerrero, Lluzhapa, Macará, Mercadillo, Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Saraguro, Taquil, Zapotillo	24 de Mayo, Alborada, Camohio, Cango Nuevo, Carmelo, Centro de la Ciudad, Chile, Cochas del Almendro, El Censo, Gonzabal, Huahuanga, Jesús del Gran Poder, Km 1 vía a Cuenca, km 1 vía Quilanga, La hamaca, La Loma, Laguar, Las Palmas, Panamá, Panecillo, Zalapa Bajo, Santo Domingo, Simón Bolívar, Vía a la Y			0	
Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total			
Directos:	19	6	25			
Indirectos:	76	24	100			
Total	95	30	125			
Tipo de ejecución:	Directa		Institución	0		
PRESUPUESTO:						
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%			
Internas	Asignación inicial	45.030,20	100%	45.030,20		
	Autogestión	-	-	-		
	Reformas	-	-	-		
Externas	GADs	-	-	-		
	Cooperación	-	-	-		
	Otros	-	-	-		
Total	45.030,20					
META / OBJETIVOS:						
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado			Avance		
Fin						
Contribuir a mejorar la productividad e inocuidad en los procesos de transformación productiva de la Provincia de Loja, mediante la implementación del programa de Buenas practicas de manufactura y certificación.	Al finalizar el proyecto, seis asociaciones o empresas agroalimentarias implementan buenas prácticas de manufactura y 20 asociaciones de productores se capacitan en procesos de generación de valor en sus procesos.					
Propósito						
Programa de Buenas Prácticas de Manufactura, valor agregado y certificación de productos en los centros de Desarrollo de DEPROSUR EP. y en Asociaciones Productivas Agroalimentarias implementado.	Al final del proyecto, se aplica el programa de BPM o valor agregado en al menos seis asociaciones agroalimentarias y se habrá obtenido la certificación o permiso de funcionamiento para al menos un producto que se elabora en los Centros de Desarrollo Productivo de DEPROSUR EP.					
Componentes	Indicador			%		
C1. Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y/o agregación de valor en el sector agroalimentario diseñado y en ejecución.	A final de año 2016, seis empresas o asociaciones productivas inician el programa de BPM en sus procesos agroalimentarios.			88,89		
C2. Registros o permisos de funcionamiento en Centros de Desarrollo Productivo de DEPROSUR EP y/o asociaciones productivas agroalimentarias obtenidos	Al final del año 2016, al menos un producto de las Unidades de Negocio de DEPROSUR y de las asociaciones agroalimentarias, cuentan con su permiso de funcionamiento o certificación sanitaria.			54,17		
Avance Físico Total Proyecto				71,53		
AVANCE PRESUPUESTARIO						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Codificado	45.030,20					
Reformas	0,00					
Total US\$	45.030,20					
Planificado	45.030,20	17.204,35	11.920,72	7.952,56	7.952,56	
Devengado	26.562,64	7.242,33	6.276,77	6.972,62	6.070,92	
Ejecución						
Presupuestaria %	58,99	42,10	52,65	87,68	76,34	
% Acumulado	58,99	16,08	13,94	15,48	13,48	
Saldo por Devengar	18.467,56					

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
I Trimestre		
En Celica la planta de lácteos La Celestial se encuentra cerrada desde el 15 de diciembre de 2015. En Gonzanamá, la planta de lácteos Gonzanameñito no existe interés en participar en el programa de BPM.	En Celica: se realizó reunión de coordinación (2 marzo) con: MAGAP, GAD Municipal y socios de la asociación; con el objeto de solucionar el problema (no se llegó a acuerdos). En Gonzanamá: se realizó gestiones con el propietario para la implementación del programa BPM (no existe interés).	Se realizará una reprogramación de las actividades del proyecto, en función de los requerimientos de organizaciones en BPM. Se realizar los diagnósticos para la implementación de BPM en los camales de los cantones de Macará y Catamayo. Las actividades se empiezan a ejecutar a partir del 25 de enero, lo que provoca retraso en la programación.
II Trimestre		
La Planta de Gonzanamalac del cantón Gonzanama, se cerro a fines de abril por factores de asociatividad. No se esta realizando actividades en la Planta la Celestial de Celica por problemas internos de la Asociación.	Se mantuvo reunión con el Gerente Sr. Francisco Conde (GONZANAMALAC), para apoyo en la solución. Se mantuvo reuniones con representantes de la Asociación de la Planta de lácteos La Celestial en conjunto con el Alcalde de Celica, MAGAP y DEPROSUR EP. para tratar de dar solución al problema de cierre de la Planta.	Se ha insistido a los directivos de las dos plantas de lácteos, a la fecha no existe ninguna respuesta. La validación de procesos e BPM mediante muestreo y análisis de laboratorio se lo esta llevando en conjunto con la titulación de ingeniería en alimentos de la UTPL, tras la forma de un convenio N° 2 DEPROSUR EP. - UTPL


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Registros de participantes en programa BPM., Check list de procesos antes y después de las BPM.	
Componente 2	Certificado o permisos de funcionamiento.	
Componente 3		0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Buenas Prácticas de Manufactura, generación de valor y certificación de productos en Centros de Desarrollo Productivo DEPROSUR EP. y Asociaciones Agroalimentarias en la provincia de Loja.

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016

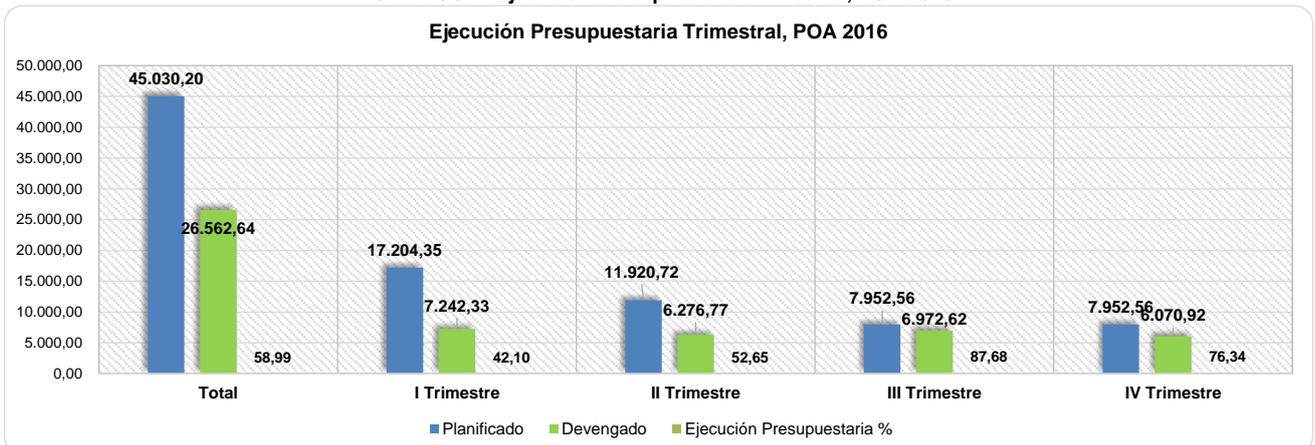

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016

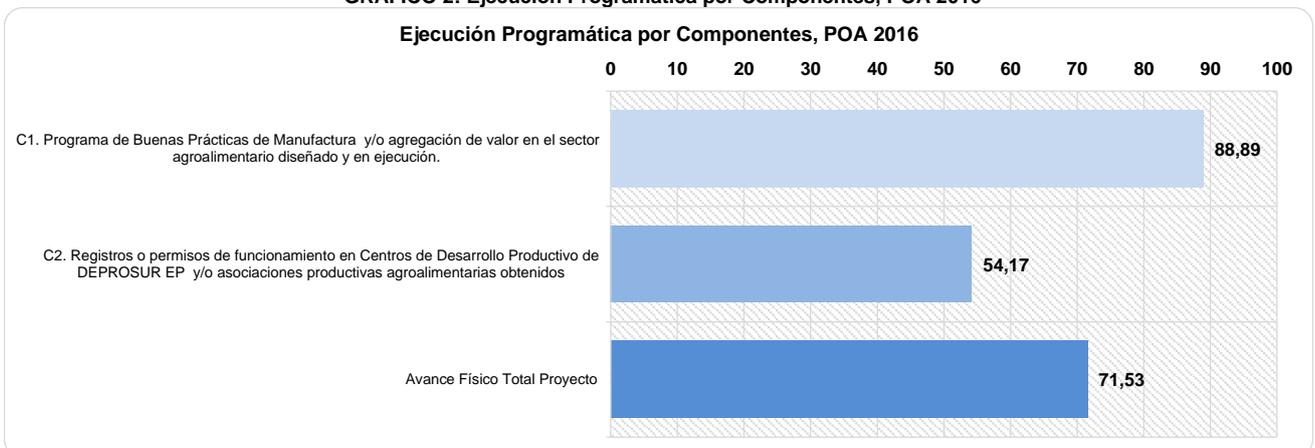

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

<p>.....</p> <p>Elaborado</p> <p>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</p>	<p>.....</p> <p>Revisado</p> <p>GERENCIA TÉCNICA</p>	<p>.....</p> <p>Aprobado</p> <p>GERENCIA GENERAL</p>
---	---	---
