

## Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:					
Nombre de proyecto:	Planta Provincial de Bioinsumos				
Fecha inicio:	01/01/2014	Fecha fin:	01/01/2024	Duración:	10 años
Unidad Ejecutora:	Gerencia Técnica Unidad de Producción de Bioinsumos (UPB)				
Coordinador:	Ing. Ángel Santiago Guaraca Bedón	Técnicos - Responsables:	Ing. Manuel Vicente Cobos Obando 1 Operador 2 Obreros (plazo fijo)		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN					
Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)		Coordenadas	
Paltas	Casanga	La Esperanza		0	
Beneficiarios:					
	Hombres	Mujeres	Total		
Directos:	601	270	871		
Indirectos:	2.404	1.080	3.484		
<b>Total</b>	<b>3.005</b>	<b>1.350</b>	<b>4.355</b>		
Tipo de ejecución:	Convenio de cooperación interinstitucional		Institución	0	
PRESUPUESTO:					
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%		
Internas	Asignación inicial	181.609,61	100%	181.609,61	
	Autogestión	-	-	-	
	Reformas	-	-	-	
Externas	GADs	-	-	-	
	Cooperación	-	-	-	
	Otros	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>181.609,61</b>	<b>100%</b>		
META / OBJETIVOS:					
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado			Avance	
<b>Fin</b>					
Contribuir al incremento de la productividad agrícola de pequeños y medianos productores con el uso de abonos orgánicos.	Al final del año, 800 entre pequeños y medianos productores son beneficiados con la adquisición de abonos orgánicos.				
<b>Propósito</b>					
Planta Provincial de producción y comercialización de bioinsumos en operación a 100% de su capacidad.	Producción anual de bioinsumos de: 2000 TN abono orgánico.			<b>54,32</b>	
Componentes		Indicador		%	
C1. Producción de bioinsumos (abono orgánico NUTRISANO) en la provincia de Loja.		Al final 2016 producción anual de bioinsumos en plataforma de 2000 TN de NUTRISANO con > 55% de Materia Orgánica en su contenido.		108,81	
C2. Promoción y Comercialización de abono orgánico NUTRISANO.		Al final del 2016, se han comercializado 1500 TN de NUTRISANO/año.		54,16	
<b>Avance Físico Total Proyecto</b>				<b>81,48</b>	
AVANCE PRESUPUESTARIO					
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Codificado	181.609,61				
Reformas	0,00				
<b>Total US\$</b>	<b>181.609,61</b>				
Planificado	181.609,61	40.651,57	48.882,55	46.037,75	46.037,75
Devengado	<b>150.246,70</b>	23.000,21	42.621,56	44.838,06	39.786,87
<b>Ejecución</b>					
Presupuestaria %	82,73	56,58	87,19	97,39	86,42
% Acumulado	82,73	12,66	23,47	24,69	21,91
Saldo por Devengar	31.362,91				
PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS					
Problemas relevantes		Acciones tomadas		Observaciones	
<b>I Trimestre</b>					
Exceso de humedad por época invernal, retrasa el proceso de compostaje.		Colocación de plásticos en camas de compostaje para evitar la humedad excesiva		En base a convenio de cooperación suscrito con la empresa azucarera MALCA, se entregaron 170.4 Tn. De Nutrisano. Se vende 32 Tn de NUTRISANO a la Mancomunidad del Bosque Seco, los cuales se encuentran en proceso de pago	
<b>II Trimestre</b>					
No se contó con materia prima para la producción de Nutrisano, por el retraso en la suscripción de convenio con MALCA.		Reuniones con Directivos de MALCA para la suscripción de convenio, (se firma el 30 de mayo de 2016).		Se mejoran los términos del convenio tomándose el 70% de merma en la materia prima; respecto al convenio anterior del 40%.	

III Trimestre		
C2. Disminución de demanda de Nutrisano en la costa ecuatoriana por crisis económica en el sector bananero y cacaoero. En el segundo trimestre, no se realizó acopio de materia prima, manteniéndose un proceso de negociación con la empresa MALCA para el aprovechamiento de los residuos, se retomó el acopio en el mes de julio.	Actualmente se encuentra suscrito un convenio para aprovechamiento de residuos con la empresa MALCA por un plazo de dos años, por lo que se contará con la materia prima necesaria. Se suscribió un convenio con el INIAP para el suministro de agua de riego permanente a la planta de Bioinsumos.	Se está trabajando en un convenio de comercialización con la empresa LUNINGOLD de la provincia de Zamora para el establecimiento de cultivos de café y cacao para el año 2017.


#### MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Análisis de laboratorio, Informe técnicos, Memorias fotográficas
Componente 2	Kardex de despacho de producto, Facturas de venta - depósitos bancarios. Acta de entrega - recepción de NUTRISANO - Malca y DEPROSUR EP.

#### REPRESENTACIÓN GRÁFICA


##### Planta Provincial de Bioinsumos

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016

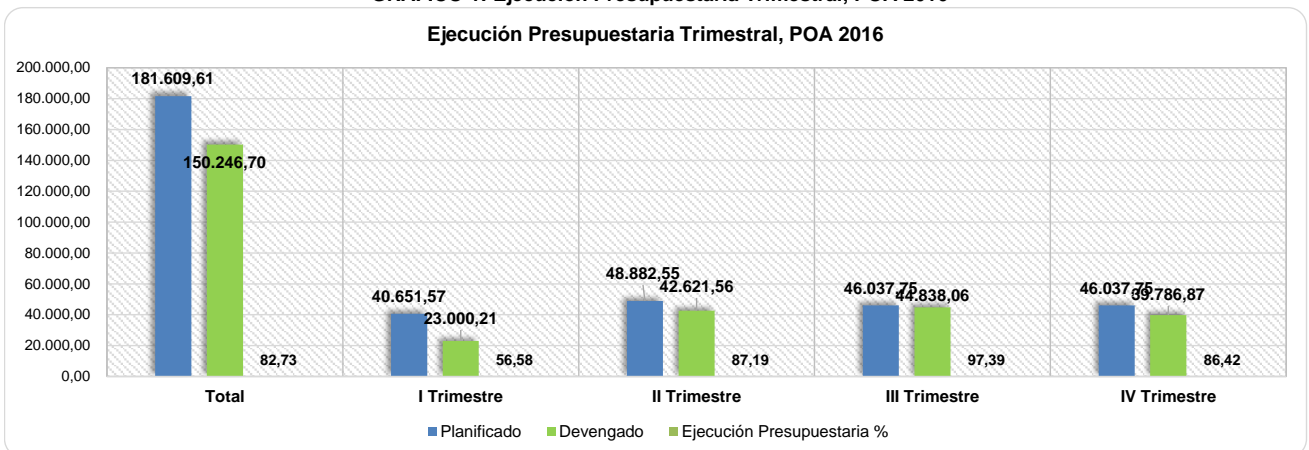

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016

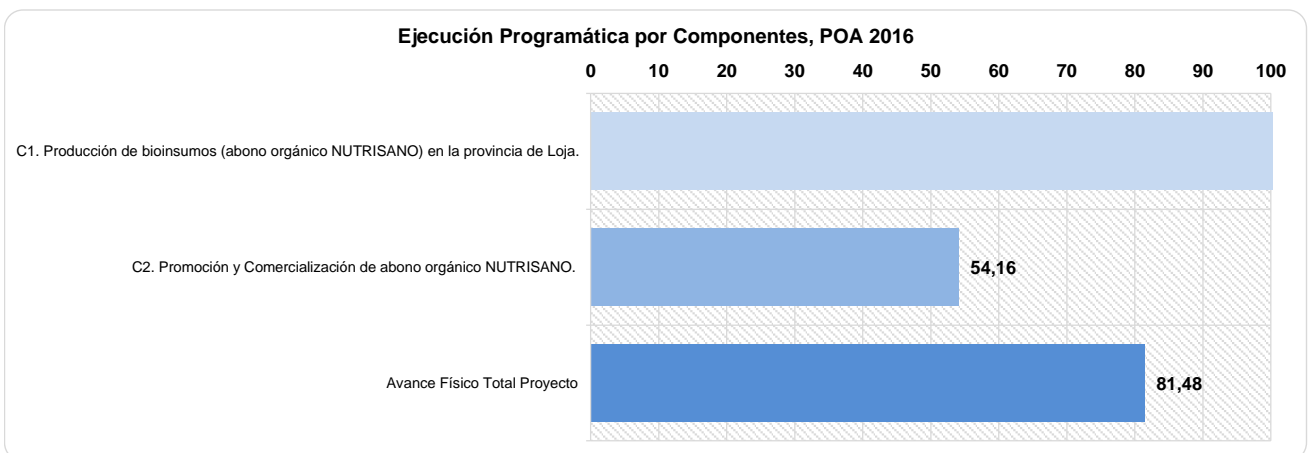

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

..... Elaborado <b>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</b>	..... Revisado <b>GERENCIA TÉCNICA</b>	..... Aprobado <b>GERENCIA GENERAL</b>
--	--	--
