

## Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
Nombre de proyecto:	Diversificación productiva de las huertas agroforestales en la parroquia Fundochamba, cantón Quilanga.					
Fecha inicio:	01/07/2014	Fecha fin:	31/03/2016	Duración:	octubre de 2016	
Unidad Ejecutora:	Gerencia Técnica Unidad de apoyo a la Producción Agropecuaria					
Coordinador:	Ing. Jorge Oswaldo Rojas Merchán		Técnicos - Responsables:	Ing. Carlos Vladimir Orellana Aguirre		
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)			Coordenadas	
Quilanga	Fundochamba	Fundochamba, Naranjito, Libertad, Lalo y El Sauce.			0	
Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total			
Directos:	24	15	39			
Indirectos:	96	60	156			
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>195</b>			
Tipo de ejecución:	Convenio de cooperación interinstitucional		Institución	MAGAP- Plan del Buen Vivir		
PRESUPUESTO:						
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%			
Internas	Asignación inicial	6.579,15	1%	6.579,15		
	Autogestión	-	-	-		
	Reformas	-	-	-		
Externas	GADs	238.501,61	38%	238.501,61		
	Cooperación	-	-	-		
	Otros	384.017,17	61%	384.017,17		
<b>Total</b>	<b>629.097,93</b>	<b>100%</b>				
META / OBJETIVOS:						
Resumen Narrativo	Indicadores de Resultado			Avance		
<b>Fin</b>						
Contribuir al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina desde una perspectiva integral y articulada en los aspectos organizativos, técnicos, económicos, sociales y ambientales.			Al final del proyecto, 116 familias están capacitadas y fortalecidas en procesos productivos, organizativos para el manejo de finca agroforestal.			
<b>Propósito</b>						
Productividad de fincas agroforestales diversificada en la parroquia Fundochamba, mejorando la seguridad alimentaria de las familias participantes.			Al final del proyecto, 116 familias mejoran sus capacidades productivas para el manejo de 49 fincas agroforestales con la implementación de riego presurizado en 49,9 ha.			<b>16,07</b>
<b>Componentes</b>						
			<b>Indicador</b>			<b>%</b>
C1. Programa de capacitación en manejo de huertos agroforestales ejecutado.			Al final del año, se ha capacitado 116 familias, de las cuales el 70% (81 familias) realizan el manejo de huertos agroforestales con la implementación de tecnología de riego presurizado.			23,20
C2. Parcelas demostrativas de café diversificadas en asociación con especies de sombra.			Al término del proyecto, se han implementado: - Cuatro parcelas demostrativas de capacitación (400 m2) con diez especies de hortalizas con riego presurizado - 43.5 ha de café en asocio con especies de sombra con riego presurizado en 116 unidades de producción .			15,00
C3. Sistemas de comercialización asociativa de café mejorado.			Al final del proyecto, el 70% de la producción de café se comercializa a través de las asociaciones del área de intervención (PROCAFEC, EL COLMENAR y FUNDOCHAMBA).			10,00
<b>Avance Físico Total Proyecto</b>						<b>16,07</b>
AVANCE PRESUPUESTARIO						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Codificado	6.579,15					
Reformas	0,00					
<b>Total US\$</b>	<b>6.579,15</b>					
Planificado	6.579,15	6.579,15	0,00	0,00	0,00	
Devengado	1.870,40	0,00	930,98	870,20	69,22	
Ejecución						
Presupuestaria %	28,43	-				
% Acumulado	28,43	0,00	14,15	13,23	1,05	
Saldo por Devengar	4.708,75					
Saldo por Comprometer	21.805,50					

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
I Trimestre		
Incumplimiento de compromisos asumidos por la comunidad para la ejecución del proyecto (capacitación y elaboración de abonos). No se implementan los sistemas de riego presurizado en finca (0.5 ha/beneficiario) por RIDRENSUR EP. lo que no permite implementación de parcelas de café.	Se suscribe una adenda al convenio específico N° 42-DPS-2014, SUL-BV-I-14-002 de cofinanciamiento para la ejecución del proyecto por 10 meses hasta 6 de octubre.	Se debe realizar una reprogramación de cada componente en función de las actividades a desarrollar las cuales deberán estar debidamente presupuestadas. Se han realizado tres visitas a dos fincas en barrio la Libertad y al vivero parroquial, además una capacitación sobre café orgánico en Fundochamba. Se seleccionará a los beneficiarios que participen activamente en el proyecto.


#### MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Registro de días de campo, Informes técnicos, Registro de participantes a talleres de capacitación, Fotografías
Componente 2	Registro de días de campo, Informes técnicos, Registro de participantes a charlas, Actas de entrega recepción de insumos agrícolas
Componente 3	Informes técnicos, Registros de participante, Fotografías

#### REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Diversificación productiva de las huertas agroforestales en la parroquia Fundochamba, cantón Quilanga.

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016

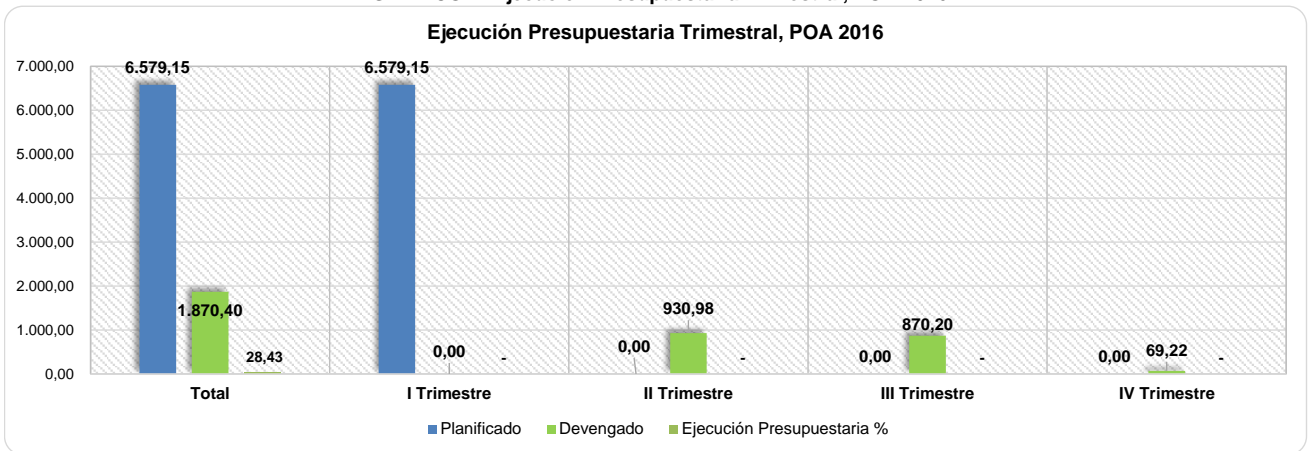

Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016

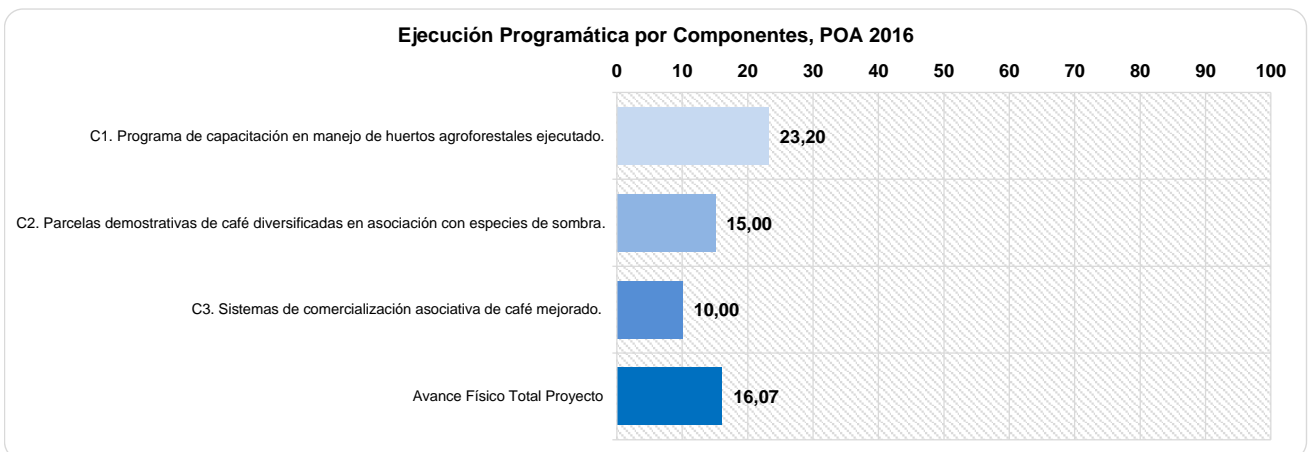

Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

..... Elaborado <b>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</b>	..... Revisado <b>GERENCIA TÉCNICA</b>	..... Aprobado <b>GERENCIA GENERAL</b>
--	--	--
