

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:						
Nombre de proyecto:	Centro de desarrollo productivo Lanzaca - Gonzanama					
Fecha inicio:	01/01/2012	Fecha fin:	31/12/2019	Duración:	5 años	
Unidad Ejecutora:	Gerencia Técnica Centro de Lanzaca - Gonzanama					
Coordinador:	Ing. Jorge Oswaldo Rojas Merchán	Técnicos - Responsables:	Dr. Max Arturo Bravo Cumbicus 1 Operador 5 Obreros			
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN						
Cantón(es)	Parroquia(s)	Barrio(s)			Coordenadas	
Gozanamá	Gozanamá	Mollepamba			0	
Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total			
Directos:	260	78	338			
Indirectos:	1.040	312	1.352			
Total	1.300	390	1.690			
Tipo de ejecución:	Directa		Institución	0		
PRESUPUESTO:						
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%			
Internas	Asignación inicial	186.371,57	100%	186.371,57		
	Autogestión	-	-	-		
	Reformas	-	-	-		
Externas	GADs	-	-	-		
	Cooperación	-	-	-		
	Otros	-	-	-		
Total		186.371,57				
META / OBJETIVOS:						
Resumen Narrativo				Indicadores de Resultado	Avance	
Fin						
Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de actividades agropecuarias de pequeños y medianos productores a través de procesos de transferencia de tecnología rural.				Al final del proyecto 1.399 ganaderos (caprinos, ovinos y bovinos) mejoran la productividad en el 25% en sus hatos, con la adquisición de ensilajes y henolajes.		
Propósito						
Proyecto integral de producción agropecuaria en el Centro de Desarrollo Productivo de Lanzaca - Gonzanamá fortalecido y diversificado.				A diciembre de 2016, se cuenta con un modelo de gestión integral productivo socializado y en operación.		85,22
Componentes						
				Indicador	%	
C1. Programa de producción de: ensilajes de maíz, alfalfa, vicia y reygrass, heno, plantas de café y cítricos fortalecido.				Al finalizar el 2016, se han producido 1600 bolsas de 40 kg de ensilaje de maíz, 1500 bolsas de alfalfa, vicia, y reygrass. 2.000 rollos de heno, producción y comercialización de 100.000 plantas de café.		49,99
C2. Centro de producción, capacitación y transferencia de tecnología en sistemas de manejo estabulado de ganado bovino, ovino y caprino en operación.				A diciembre del 2016 se contará con un Centro demostrativo en sistemas de manejo de ganado bovino de leche, estabulado, desarrollado y en operación, beneficiando a 184 ganaderos de la provincia de Loja.		125,00
C3. Infraestructura productiva mejorada.				Al término del año 2016, se ha adecuado un 50% de la infraestructura del Centro integral de desarrollo productivo Lanzaca. (establo, planta de silos, biodigestor, reservorios, sistema de riego, aprisco y establo escuela y mecanización agrícola.		80,66
Avance Físico Total Proyecto						85,22
AVANCE PRESUPUESTARIO						
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Codificado	186.371,57					
Reformas	0,00					
Total US\$	186.371,57					
Planificado	186.371,57	67.750,53	39.780,21	39.060,61	39.780,21	
Devengado	151.745,67	29.096,82	37.498,14	44.842,92	40.307,79	
Ejecución						
Presupuestaria %	81,42	42,95	94,26	114,80	101,33	
% Acumulado	81,42	15,61	20,12	24,06	21,63	
Saldo por Devengar	34.625,90					


PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
I Trimestre		
No se realizó un programa adecuado para la producción de silo y heno lo que dificulta cumplir la programación. Situación invernal retraso las siembras de maíz y alfalfa.	Las siembra de maíz y alfalfa se realizaron a finales del mes de marzo e inicios de abril.	Se debe reprogramar las actividades de producción de maralfalfa, vicia y reygrass; se cambia por Cuba 20 con una producción de 100 bolas de 40 kg.
II Trimestre		
Retraso en la adquisición de insumos agrícolas (semillas de maíz, fertilizantes, herbicidas), provocando el cumplimiento de metas trimestrales. Cambios de temperaturas ocasiona presencia de enfermedades respiratorias en los animales (cabras) y además, baja productividad en los cultivos.	Se insistió de manera verbal al encargado del trámite de las adquisiciones la compras de los insumos. Instalación de cortinas plásticas en el aprisco para reducir las corrientes de aire por las noches.	A la fecha la Gerencia Administrativa - Financiera ha realizado la adquisición, no se completa la entrega de estos insumos a la Granja de Lanzaca.
III Trimestre		
Baja cantidad de agua en las tomas de La Chorrera, y las Peñas, ocasiona retraso en las siembras y cultivos de alfalfa, maíz, zarandaja, café, animales y consumo humano.	Adecuación y limpieza del reservorio de agua cuya capacidad es de 900 m3.	Se realizó una reprogramación en el plan de producción anual, en donde se incluye la producción de silos de maralfalfa, vicia y rey grass e infraestructura productiva (biogestor y sistema de riego).
IV Trimestre		
En el mes de noviembre no se contó con el agua suficiente para riego en los cultivos de maíz y alfalfa, provocando retraso en su crecimiento y pérdida del 5% en el cultivo de alfalfa. Se presentó la mortalidad del macho reproductor Sanen en el proceso de descornado.	Se realizó el mantenimiento de la bomba de agua con la finalidad de regar los cultivos en las épocas de estiaje. Se realizó la autopsia (Dr. Dany Seraquive y Dr. William Abad) con la presencia de la Comisaría de Policía Nacional Ab. Paquita Cueva., determinándose la muerte por paro cardíaco.	Se recomienda la construcción de una nueva capacitación para el sistema de riego en el sector de la Chorrera, ya que el existente no cumple con los requerimientos que demandan las actividades productivas del Centro Lanzaca.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Informes técnicos, Registros de producción, Informes de venta por producto, facturas por Ventas realizadas.
Componente 2	Informes técnicos, Registros de producción, Registros de ventas
Componente 3	Informes de administración de contratación de obra.


REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Centro de desarrollo productivo Lanzaca - Gonzanama
GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016

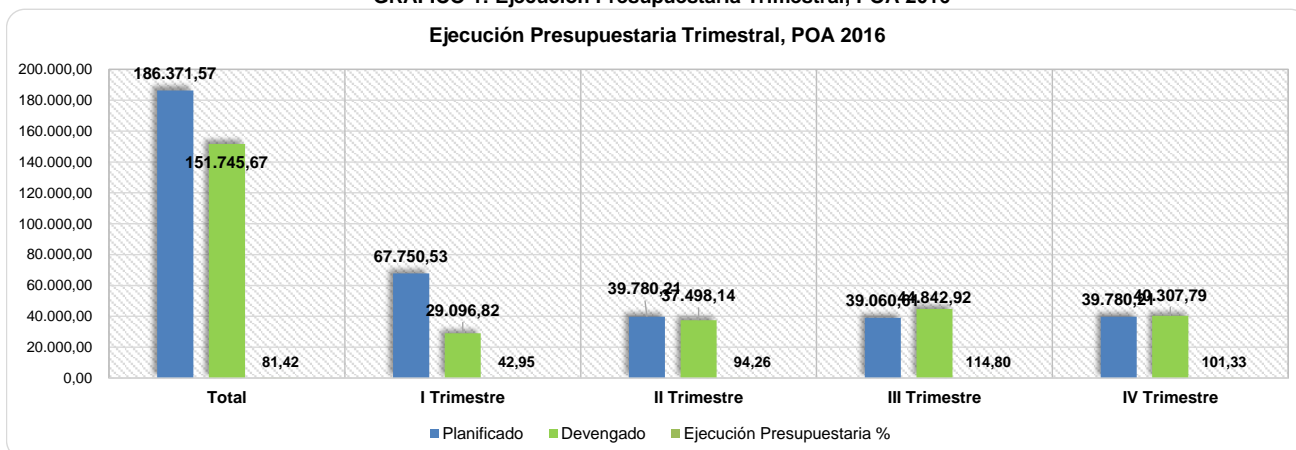

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016

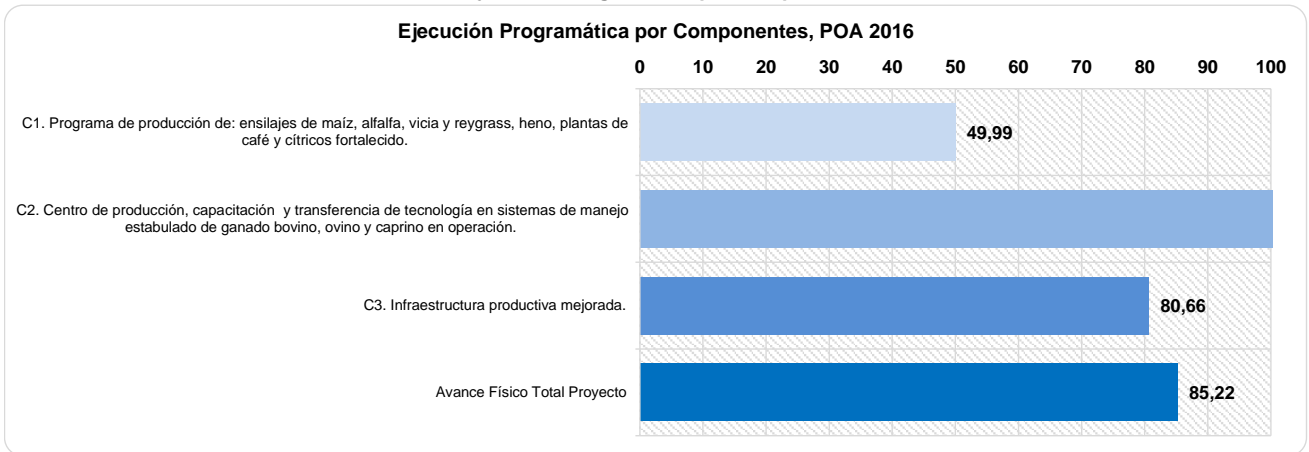

Fuente: DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

<p>.....</p> <p>Elaborado</p> <p>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</p>	<p>.....</p> <p>Revisado</p> <p>GERENCIA TÉCNICA</p>	<p>.....</p> <p>Aprobado</p> <p>GERENCIA GENERAL</p>
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------
