

Informe Resumen de Proyecto

DATOS GENERALES:																											
Nombre de proyecto:	Fomento de la producción piscícola en la Provincia de Loja.																										
Fecha inicio:	01/01/2015	Fecha fin:	31/12/2016	Duración:	1 año																						
Unidad Ejecutora:	Desarrollo Productivo Gerencia Técnica Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuario																										
Coordinador:	Ing. Jorge Oswaldo Rojas Merchán		Técnicos - Responsables:	Ing. Fanny Gabriela Guerrero Erraez																							
COBERTURA Y LOCALIZACIÓN																											
Cantón(es)	Parroquia(s)		Barrio(s)																								
Gonzanamá, Loja, Paltas, Sozoranga	Cangonamá, Chuquiribamba, El Cisne, Gonzanamá, Sacapalca, Tacamoros, Yamana, Purunuma, San Lucas, Taquil.		Pitapuro Alta, Centro de Cangonamá, Chalanga, Guaraguara, La Sapa, El Coco, Carmelo, La Cebada, Tunaspamba, Yambila, Polo-Polo, Cañi, Chincurña, Falta, SanJosé, Santa Teresita, El Tejar, Cana, Combolo, Encuentros, Purunuma Centro, El Verde, El Changui, Los Puentes, Shnayacu, El Colambo, Cabuyos, Los Canutos, Purunuma centro, Centro de Cangonamá, Saracapa, Tesalia, Tesalia Alto, Tesalia, Zañe, Huayllas, Reina del Cisne, Cera, Limón Bajo, Llanitos, Pedregal, Limón Alto, Guadual, Las Delicias, Culquimine, Socorro																								
Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Total	<table style="display: none;"> <tr><td>Hombres</td><td>103</td></tr> <tr><td>Mujeres</td><td>37</td></tr> </table>			Hombres	103	Mujeres	37																	
Hombres	103																										
Mujeres	37																										
Directos:	103	37	140																								
Indirectos:	412	148	560																								
Total	515	185	700																								
Tipo de ejecución:	Convenio de cooperación interinstitucional		Institución	GAD Municipal de Macará																							
PRESUPUESTO:																											
Fuentes de Financiamiento	Aportes:	US %	%	<table style="display: none;"> <tr><td>Asignación inicial</td><td>30.106,22</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Autogestión</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Reformas</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>GADs</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Cooperación</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Total</td><td>30.106,22</td><td></td></tr> </table>			Asignación inicial	30.106,22	100%	Autogestión	-	-	Reformas	-	-	GADs	-	-	Cooperación	-	-	Otros	-	-	Total	30.106,22	
Asignación inicial	30.106,22	100%																									
Autogestión	-	-																									
Reformas	-	-																									
GADs	-	-																									
Cooperación	-	-																									
Otros	-	-																									
Total	30.106,22																										
Internas	Asignación inicial	30.106,22	100%	30.106,22																							
	Autogestión	-	-	-																							
Externas	Reformas	-	-	-																							
	GADs	-	-	-																							
	Cooperación	-	-	-																							
	Otros	-	-	-																							
Total		30.106,22																									
META / OBJETIVOS:																											
Resumen Narrativo				Indicadores de Resultado	Avance																						
Fin																											
Contribuir a mejorar la calidad de vida y la diversificación pecuaria en la Provincia de Loja.			Al finalizar el proyecto, 744 productores de trucha y tilapia mejoran sus ingresos familiares en un promedio de US \$ 1,500 por actividades piscícola.																								
Propósito																											
Producción piscícola en la Provincia de Loja implementada.			Al final del proyecto 744 productores implementan 744 piscinas de producción piscícola con una área de 50 m2.		47,83																						
Componentes																											
			Indicador		%																						
C1. Programa de capacitación y asistencia técnica de producción piscícola implementado.			Al final del año 2016, 120 productores piscícolas se capacitan en manejo de tilapia y trucha arcoiris con énfasis en BP de producción acuícola, de los cuales el 70% aplican la capacitación recibida en sus estanques piscícolas.		69,77																						
C2. Piscinas de producción piscícola rehabilitadas e implementadas.			Al finalizar el 2016, se han construido 120 piscinas de producción piscícola con una área de 50 m2 en los cantones de Saraguro, Gonzanamá, Sozoranga, Loja, Pindal y Paltas.		69,17																						
C3. Canales de comercialización de tilapia y trucha establecidos.			Al final del año, se ha establecido un canal de comercialización alcanzándose una venta anual de 67,200 lb de tilapia y 14,400 trucha arcoiris.		4,55																						
Avance Físico Total Proyecto					69,27																						
AVANCE PRESUPUESTARIO																											
PRESUPUESTO US\$	Total	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre																						
Codificado	30.106,22																										
Reformas	0,00																										
Total US\$	30.106,22																										
Planificado	30.106,22	17.610,26	4.658,12	3.918,92	3.918,92																						
Devengado	9.154,13	230,63	3.895,22	1.082,10	3.946,18																						
Ejecución																											
Presupuestaria %	30,41	1,31	83,62	27,61	100,70																						
% Acumulado	30,41	0,77	12,94	3,59	13,11																						
Saldo por Devengar	20.952,09																										

PROBLEMAS PRESENTADOS Y ACCIONES TOMADAS Y/O SOLICITADAS PARA RESOLVERLOS		
Problemas relevantes	Acciones tomadas	Observaciones
I Trimestre		
Taquil: No se llega a acuerdos entre el presidente del GAD Parroquial de Taquil y la Junta de Regantes para la adquisición de alevines. El invierno retrasa la excavación de estanques en la parroquia Sacapalca.	Se organizó una reunión de coordinación con el Pdte. del GAD Parroquial y directiva de Junta de Regantes. Se reprogramó las actividades en la parroquia Sacapalca.	Se contrata el técnico piscícola a partir del 19 de enero de 2016.
II Trimestre		
En la parroquia Chaquinal el Pdte. Del GAD indica que no cuenta con presupuesto para el presente año. En la parroquia Cangonamá se retrasó la intervención por la temporada invernal. En la parroquia El Cisne, se retrasó por la adquisición de la maquinaria por el GAD. En la parroquia Chantaco, se realizaron nuevas inspecciones. En la parroquia Taquil no cumple con la entrega de alevines. En la parroquia Chuquiribamba se espera la firma de convenio.	Se mantuvo reuniones con los presidentes de los GADS Parroquiales en las que se solicitó el cumplimiento de compromisos asumidos en la ejecución del proyecto.	A la presente fecha no se tiene respuestas favorables para la ejecución del proyecto.
III Trimestre		
Retraso en la programación de siembras de alevines por falta de lluvias y por la no adquisición oportuna de los GADS Parroquiales. No adecuación de estanques por parte de los beneficiarios. Retraso en la entrega de alevines por parte del proveedor.	Se solicitó mediante email y llamadas telefónicas a los presidentes de los GAS parroquiales la adquisición oportuna de materiales e insumos. Se apoyo a los beneficiarios en la adecuación de estanques.	Se sugiere la revisión de los convenios de cooperación suscritos con los GADS Parroquiales para la elaboración de los informes de avance y cierre correspondientes.
IV Trimestre		
Chuquiribamba, El Cisne y Cangonamá: retraso en la adquisición de alevines por parte de los GADS parroquiales. El Cisne: Retraso en la excavación de 30 estanques por la demora en la compra de la maquinaria (excavadora) por parte del GAD parroquial. Cangonamá: El invierno en la parroquia retrasó la excavación de 21 estanques (desde el mes de enero hasta marzo). Chuquiribamba: Retraso de siembra de alevines en verano prolongado (octubre hasta diciembre).	Se realizó la construcción de seis estanques manualmente en coordinación con los beneficiarios.	Se coordinó con los presidentes de los GADS parroquiales de Chuquiribamba y Cangonamá realizar las siembras en el mes de enero de 2017


MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Componente 1	Registros de participantes, Guías de manejo
Componente 2	Verificación insitu, Informes técnicos, Registro de unidades productivas
Componente 3	Registro de ventas, Informes técnicos

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


Fomento de la producción piscícola en la Provincia de Loja.

GRAFICO 1: Ejecución Presupuestaria Trimestral, POA 2016

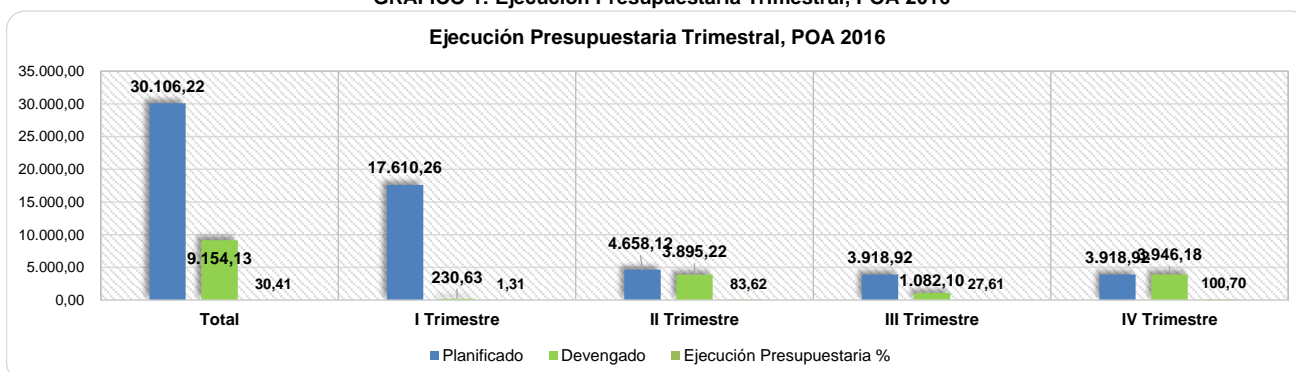

Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Administrativa - Financiera. Cédula Presupuestaria de Gastos, marzo 2016

GRAFICO 2: Ejecución Programática por Componentes, POA 2016

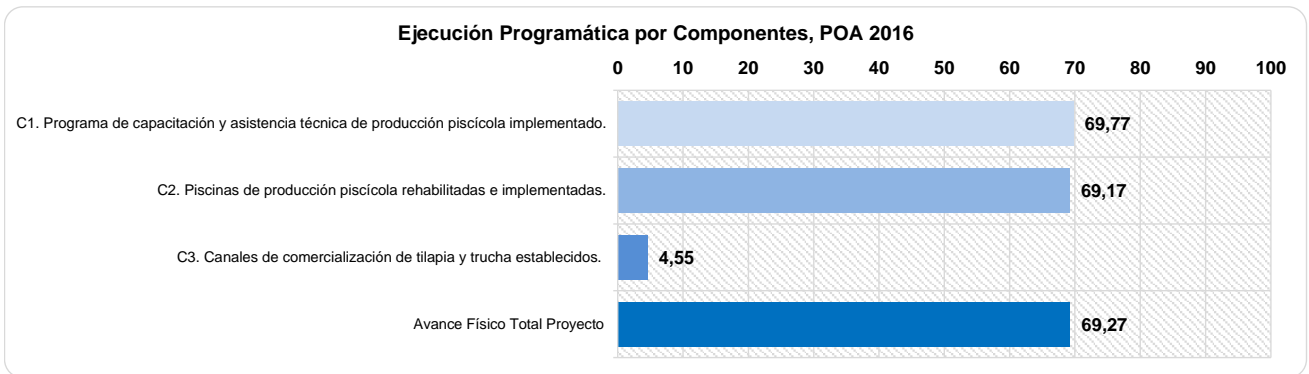

Fuente : DEPROSUR EP. Gerencia Técnica, Unidad de Apoyo a la Producción Agropecuaria, 2016

<p>.....</p> <p>Elaborado</p> <p>ASESORÍA DE PLANIFICACIÓN</p>	<p>.....</p> <p>Revisado</p> <p>GERENCIA TÉCNICA</p>	<p>.....</p> <p>Aprobado</p> <p>GERENCIA GENERAL</p>
---	---	---
